# TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



## RELATÓRIO PLANO DE OBRAS JUNHO/2022

## SUMÁRIO

1.	PRIN	ICIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO	4
	1.1	OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS	4
	1.2	OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS	6
	1.3	OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – <mark>3 OBRAS</mark>	7
	1.4	PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 24 PROJETOS	8
	1.5	PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 4 PROJETOS	13
	1.6	PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA	14
	1.7	TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS	14
	1.1	TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS	16
2.	REL	ATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR	18
3.	REL	ATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)	20
4.	LOC	ALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	23
5.	AÇÕ	ES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 15 AÇÕES	24
6.	DES	EMBOLSOS TOTAIS	26
	6.1 EV	DLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório)	26
7.	CON	TRATOS DE MANUTEÇÃO E ATAS	28
	7.1	MANUTENÇÃO ELEVADORES	28
	7.2	MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO	29
	7.3	MANUTENÇÃO GERADORES	30
	7.4	MANUTENÇÃO PREDIAL	31
	7.5	MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER	36
	7.6	ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	37
	7.7	ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	38
	7.8	DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED	39
8	ANE	хо	39
	8.1	MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS	39
	8.2	MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS	42
	8.3	MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS	44
	8.4	REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA — UNIDADES ATENDIDAS	45
	8.5	MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS	48

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 25/07/2022.

#### Observações:

- 1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado obras e projetos:
  - Todo dado indicado de % financeiro executado refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento Econômico Financeiro.
  - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo.
- 2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
  - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como "em andamento" a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
  - Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

#### 1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

## 1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS

1 LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL	Construção Bloco Criminal	STATUS
Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 62.624.349,34	
Contratado	SALVER CONSTRUTORA E IN	ICORPORADORA
	LTDA	
Emissão OES	março, 2020	
Data prevista conclusão	julho, 2022	
Prazo previsto execução (meses)	27	
Prazo decorrido de execução (meses)	27	
% fisico realizado	30,14%	
Medição realizada	<u>7ª / 20</u>	
Medição requerida		
% financeiro realizado consolidado	37,56%	
Saldo a pagar	R\$ 39.102.204,27	
% financeiro não consolidado (se houver)	dado (se houver)	
Termo de Recebimento		
Inauguração/Ocupação		
Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/	/2020 realizado 6,75%	

2 AMPÉRE - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS		
Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 6.133.337,92			
Contratado	CONSTRUTORA GUILHER	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA		
Emissão OES	outubro, 2019			
Data prevista conclusão	dezembro, 2021			
Prazo previsto execução (meses)	25			
Prazo decorrido de execução (meses)	32	32		
% fisico realizado	60,16%			
Medição realizada	11ª / 14			
Medição requerida				
% financeiro realizado consolidado	58,82%			
Saldo a pagar	R\$ 2.525.703,95			
% financeiro não consolidado (se houver)				
Termo de Recebimento				
Inauguração/Ocupação				

3	FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	STATUS	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 40.872.133,96		
Contratado		SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
	Emissão OES	outubro, 2020		
	Data prevista conclusão	agosto, 2022		
	Prazo previsto execução (meses)	21		
Prazo decorrido de execução (meses) % fisico realizado		20		
		22,75%		
	Medição realizada	7ª / 18	·	

Medição requerida	8 <u>a</u>
% financeiro realizado consolidado	23,50%
Saldo a pagar	R\$ 31.267.691,91
% financeiro não consolidado (se houver)	
Termo de Recebimento	
Inauguração/Ocupação	

4 CORBÉLIA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS	
Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 9.378.308,06		
Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA		
Emissão OES	novembro, 2021		
Data prevista conclusão	janeiro, 2023		
Prazo previsto execução (meses)	13		
Prazo decorrido de execução (meses)	7		
% fisico realizado	4,66% 1ª / 13		
Medição realizada			
Medição requerida	2 <u>a</u>		
% financeiro realizado consolidado	3,55%		
Saldo a pagar	R\$ 9.045.122,11		
% financeiro não consolidado (se houver)			
Termo de Recebimento			
Inauguração/Ocupação			

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:



## **1.2** OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.

1 BELA VISTA DO PARAÍSO	Construção Fórum Novo	
Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 8.156.223,56	
Contratado	CONSTRUTORA PROJETO	NOVO LTDA
Emissão OES	maio, 2018	
Data prevista conclusão	setembro, 2019	
Prazo previsto execução (meses)	16	
		FORA DA DATA
Prazo decorrido de execução (meses)	27	PREVISTA
% físico realizado	100,00%	
% financeiro realizado consolidado	100,00%	
Termo de Recebimento	Provisório	PROV. Março, 2020
	Definitivo programado	sem programação
Inauguração/Ocupação		janeiro, 2021
Conclusão		

2 CURITIBA - PRÉDIO ANEXO	O ANEXO EM OBRA SONORIZAÇÃO PRÉDIO ANEXO			
Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 4.953.726,74	R\$ 4.953.726,74		
Contratado	SEAL TELECOM COMERCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	O E SERVIÇOS DE		
Emissão OES	outubro, 2019			
Data prevista conclusão	maio, 2020			
Prazo previsto execução (meses)	6			
		FORA DA DATA		
Prazo decorrido de execução (meses)	33	PREVISTA		
% físico realizado	100,00%			
% financeiro realizado consolidado	96,78%			
Termo de Recebimento	Provisório	PROV. Outubro, 2021		
	Definitivo programado	sem programação		
Inauguração/Ocupação		outubro, 2021		
Conclusão				

## 1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 3 OBRAS

1	NOVA AURORA - PADRÃO 1500	Construção I	Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação		R\$ 10.662.652,24
	Início do procedimento de preparação da licitaçã	0	novembro, 2021
	Prazo estimado emissão Edital ao DP		FINALIZADO
	Publicação do Edital		FINALIZADO
	Homologação da Licitação	previsão	FINALIZADO
	Assinatura do Contrato	previsão	FINALIZADO
	Fase atual		aguardando OS

2	TERRA RICA - PADRÃO 1500	Construção	Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação		R\$ 11.198.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitaçã	ío	dezembro, 2021
	Prazo estimado emissão Edital ao DP		FINALIZADO
	Publicação do Edital		FINALIZADO
	Homologação da Licitação	previsão	junho, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão	julho, 2022
	Fase atual		Em licitação

3	PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500	Construção l	Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação		R\$ 10.500.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitaçã	ío	março, 2022
	Prazo estimado emissão Edital ao DP		FINALIZADO
	Publicação do Edital		FINALIZADO
	Homologação da Licitação	previsão	julho, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão	julho, 2022
	Fase atual		Em licitação (deserta)

## **1.4** PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 25 PROJETOS

1 MARINGÁ - PROJETOS	Construção Fórum Novo	STATUS
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 899.994,58	
	GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS	
Contratado	GERENCIAMENTO DE OI	BRAS LTDA
Emissão OES	outubro, 2018	
Prazo previsto execução (meses)	41	
Prazo decorrido de execução (meses)	45	
Previsão de conclusão	março, 2022	
% físico realizado	Fases previstas	
	Fases recebidas	3
% financeiro realizado consolidado	93,61%	
Saldo a pagar	R\$ 57.548,84	
% financeiro não consolidado (se houver)		
MARINGÁ - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
	R\$ 199.633,89	93,75%

CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS	Construção CJC	STATUS
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 4.981.060,31	
Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUI	TETURA LTDA
Emissão OES	junho, 2018	
Prazo previsto execução (meses)	54	
Prazo decorrido de execução (meses)	49	
Previsão de conclusão	dezembro, 2022	
% físico realizado	Fases previstas	6
	Fases recebidas	2
% financeiro realizado consolidado	45,06%	
Saldo a pagar	R\$ 2.736.638,22	
% financeiro não consolidado (se houver)		
EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO		
CURITIRA CENTRO HIRICIÁRIO		
CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO		
ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
	R\$ 901.144,22	26,97%

3	COLOMBO - PROJETOS	Construção Fórum Novo	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 457.187,55	
		SOBE SERVIÇOS,	
		OBRAS E	
		EMPREENDIMENTOS LTDA.	
	Contratado	ME	
	Emissão OES	dezembro, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	36	
	Prazo decorrido de execução (meses)	31	
	Previsão de conclusão	dezembro, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	1
	% financeiro realizado consolidado	53,47%	
	Saldo a pagar	R\$ 212.709,85	
	% financeiro não consolidado (se houver)		

CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO AMBIENTAL		
COLOMBO - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO	R\$ 114.800,00	40,00%

PONTA GROSSA - PROJETOS	Construção Fórum Novo	STATUS
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 784.739,75	
	ENAR ENGENHARIA E	ARQUITETURA
Contratado	LTDA	•
Emissão OES (reinicio de contrato)	outubro, 2020	
Prazo previsto execução (meses)	21	
Prazo decorrido de execução (meses)	21	
Previsão de conclusão	julho, 2022	
% físico realizado	Fases previstas	5
	Fases recebidas	1
% financeiro realizado consolidado	39,87%	
Saldo a pagar	R\$ 471.843,85	
% financeiro não consolidado (se houver)		
PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
	R\$ 164.800,00	62,00%

CAMPO MOURÃO, PARANAVAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000		
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 447.447,00	
Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
Emissão OES	julho, 2020	
% físico realizado	Fases previstas	13
	Fases recebidas	3
% financeiro realizado consolidado	24,70%	
Saldo a pagar	R\$ 336.927,59	
% financeiro não consolidado (se houver)		

5	CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	21	
	Prazo decorrido de execução (meses)	24	
	Previsão de conclusão	abril, 2022	
6	PARANAVAÍ - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	23	
	Prazo decorrido de execução (meses)	24	
	Previsão de conclusão	junho, 2022	
7	UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	30	
	Prazo decorrido de execução (meses)	24	
	Previsão de conclusão	janeiro, 2023	·

NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MA FÓRUM PADRÃ	NGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 397.624,71
,	

	JCASTRO&PERTSCHI AR	OLUTETLIDA E
Contratado	URBANISMO LTDA	•
Emissão OES	fevereiro, 2021	1112
% físico realizado	Fases previstas	34
,	Fases recebidas	5
% financeiro realizado consolidado	65,99%	
Saldo a pagar	R\$ 135.212,66	
% financeiro não consolidado (se houver)	10 100.212,00	
8 NOVA AURORA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021	3177103
Prazo previsto execução (meses)	10	
Prazo decorrido de execução (meses)	10	
Previsão de conclusão	janeiro, 2022	
9 JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021	3177103
Prazo previsto execução (meses)	16	
Prazo decorrido de execução (meses)	16	
Previsão de conclusão	julho, 2022	
10 BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500	Construção Novo Fórum	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021	SIATOS
Prazo previsto execução (meses)	17	
Prazo decorrido de execução (meses)	16	
Previsão de conclusão	agosto, 2022	
11 PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021	SIATOS
Prazo previsto execução (meses)	11	
Prazo decorrido de execução (meses)	13	
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022	
12 TERRA RICA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021	3177703
Prazo previsto execução (meses)	13	
Prazo decorrido de execução (meses)	13	
Previsão de conclusão	abril, 2022	
13 PEABIRÚ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	15	
Prazo decorrido de execução (meses)	16	
Previsão de conclusão		
	iunho, 2022	
	junho, 2022 Construção Fórum Novo	STATUS
14 IPORÃ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
14 IPORÃ - PADRÃO 1500 Emissão OES	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021	STATUS
IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 15	STATUS
IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 15 16	STATUS
IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 15 16 junho, 2022	
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 15 16 junho, 2022 Construção Fórum Novo	STATUS STATUS
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  15 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500  Emissão OES	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 15 16 junho, 2022	
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  15 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 15 16 junho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021	
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  15 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021  15 16 junho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 16 16	
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  15 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021  15 16 junho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 16 16 julho, 2022	STATUS
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Previsão de conclusão  15 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 15 16 junho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 16 16 julho, 2022 Construção Fórum Novo	
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  15 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500  Emissão OES	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021  15 16 junho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 16 16 julho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021	STATUS
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Previsão de conclusão  15 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  16 MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021  15 16 junho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 16 16 julho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 17	STATUS
14 IPORÃ - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  15 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500  Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)  Previsão de conclusão  MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500  Emissão OES	Construção Fórum Novo fevereiro, 2021  15 16 junho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021 16 16 julho, 2022 Construção Fórum Novo fevereiro, 2021	STATUS

Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	16
Prazo decorrido de execução (meses)	16
Previsão de conclusão	julho, 2022

JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLOF LOANDA E MARIALVA – NO		TEUS DO SUL,
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 208.999,	00
Contratado	PROJETARE ENGENHAI	RIA I TDA-MF
Emissão OES	julho, 2021	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
% físico realizado	Fases previstas	10
	Fases recebidas	1
% financeiro realizado consolidado	9,85%	
Saldo a pagar	R\$ 188.412,60	
% financeiro não consolidado (se houver)		
18 JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	9	
Prazo decorrido de execução (meses)	12	
Previsão de conclusão	abril, 2022	
19 PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	12	
Prazo decorrido de execução (meses)	12	
Previsão de conclusão	julho, 2022	
20 QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	10	
Prazo decorrido de execução (meses)	12	
Previsão de conclusão	maio, 2022	
LOANDA - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	11	
Prazo decorrido de execução (meses)	12	
Previsão de conclusão	junho, 2022	
MARIALVA - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	12	
Prazo decorrido de execução (meses)	12	
Previsão de conclusão	julho, 2022	CTATUS.
SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	13	
Prazo decorrido de execução (meses)	12	
Previsão de conclusão  COLORADO - PADRÃO 1800	agosto, 2022  Construção Fórum Novo	CTATUC
		STATUS
Emissão OES  Prazo previsto execução (meses)	julho, 2021 11	
Prazo previsto execução (meses)  Prazo decorrido de execução (meses)	11 12	
Previsão de conclusão	junho, 2022	
rievisau de culiciusau	juilio, 2022	

Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 0,00	
Contratado	ST ELETRICID	ADE
Emissão OES	outubro, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	4	
Prazo decorrido de execução (meses)	9	
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022	
% físico realizado	Fases previstas	3
	Fases recebidas	0
% financeiro realizado consolidado	#DIV/0!	
Saldo a pagar	#DIV/0!	
% financeiro não consolidado (se houver)	#DIV/0!	

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:



## **1.5** PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 4 PROJETOS

1	STO ANTÔNIO DA PLATINA - PADRÃO 5000	Construção Fórum Novo	PRAZO OK			
_			ALERTA			
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 100.000,00	ATRASADO			
	Início do procedimento de preparação da contratação	INICIADO				
	Prazo estimado homologação da contratação	Suspenso				
	Prazo estimado emissão OES	Suspenso				
	Prazo estimado conclusão dos projetos	Suspenso				
	Fase ou localização atual					
	DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES					

2	IRATI - PADRÃO 5000	Construção Fórum Novo	PRAZO OK			
			ALERTA			
	Valor máximo estimado licitação	ATRASADO				
	Início do procedimento de preparação da contratação	INICIADO				
	Prazo estimado homologação da contratação	Suspenso				
	Prazo estimado emissão OES	Suspenso				
	Prazo estimado conclusão dos projetos	Suspenso				
	Fase ou localização atual DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES					

3	CURITIBA - SEDE MAUÁ (USINA FOTOVOLTÁICA)	Usina Fotovoltáica	PRAZO OK		
3			ALERTA		
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 23.485,00	ATRASADO		
	Início do procedimento de preparação da licitação	INICIADO			
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	EMITIDO			
	Prazo estimado publicação do Edital	PUBLICADO			
	Prazo estimado homologação da licitação	Prazo estimado homologação da licitação			
	Prazo estimado emissão OES	julho, 2022			
	Fase ou localização atual				
	DCCO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO				

4	CENTENÁRIO DO SUL, RIBEIRÃO DO PINHAL, CLEVEI JOAQUIM TÁVORA, IRETAMA E CARLÓPOLIS - NOVO	PRAZO OK		
4	JOAQUIM TAVORA, IRETAMA E CARLOPOLIS - NOV	ALERTA		
	Valor máximo estimado licitação	ATRASADO		
	Início do procedimento de preparação da licitação	INICIADO		
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	junho, 2022		
	Prazo estimado publicação do Edital	junho, 2023		
	Prazo estimado homologação da licitação		julho, 2022	
	Prazo estimado emissão OES	agosto, 2022		
	Fase ou localização atual DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES			

#### 1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA

No período não foram elaborados projetos arquitetônicos específicos para obras novas e/ou estudos de viabilidade.

#### 1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS

Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de significativa de *status* nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno em curso, exceto pelo início do procedimento de oferta/vistoria de área na Comarca de Jaguapitã.

CON	ИARCA	EXPEDIENTE	STATUS	OBSERVAÇÕES	MOV. SEI
1	ALTO PARANÁ	0044842- 67.2015	SUSPENSO. AGUARDA POSIÇÃO DA COMARCA	TERR. CONSIDERADO INADEQUADO.  SUGERIDO COMARCA BUSCA DE NOVAS OPÇÕES  AGUARDA POSICIONAMENTO DA COMARCA	7159920
2	MORRETES	0065613- 61.2018	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 11/2014	7649592
3	PIRAÍ DO SUL	0065866- 15.2019	ELEITO	DESPACHO DE ELEIÇAO ASSINADO, ENVIADO À COMARCA PARA FORMALIZAR DOAÇÃO JUNTAMENTE COM A PREFEITURA	7158450
4	CÂNDIDO DE ABREU	0017074- 64.2018	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, AGUARDA ANÁLISE DA ARQUITETURA DESDE 07/2020	7398511
5	PARANAGUÁ	0083854- 54.2016	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 04/2018	2935335
6	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	0055920- 19.2019	EM ANÁLISE	OFICIADA PREFEITURA PARA INFORMAR SE MANTÉN-SE A PROPOSTA DA DOAÇÃO.	7811869
7	CAPANEMA	0026468- 61.2019	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 11/2020 TRATATIVAS PARA PERMUTA SENDO REALIZADAS EM GRAU DE SECRETÁRIA DO TJPR	7084627

				AGUARDA INFORMAÇÃO DO DP	
8	SENGÉS	0095784- 64.2019	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 08/2020	5484053
9	SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	0061298- 53.2019	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 12/2020 (SOBRESTADO)	7803160
10	PITANGA	0086215- 39.2019	EM ANÁLISE	EMITIDO RELATÓRIO DE VISTORIA, A SER ENCAMINHADO À ARQUITETURA	7398458
11	MEDIANEIRA	0053483- 05.2019	EM ANÁLISE	NA ENGENHARIA PARA VISTORIAR NOVA ÁREA OFERTADA	7675968
12	PIRAQUARA	0080776- 47.2019	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA E PELA ARQUITETURA, AGUARDA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELA DIREÇÃO DO FÓRUM (MATRÍCULA E OFÍCIO DOADOR)	6366887
13	JAGUAPITÃ	0075981- 27.2021	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA ENCAMINHADO A DIV ARQUITETURA	7888174

#### **1.1** TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS

No período, não houve alteração na planilha de terrenos doados e regularizados. Comarcas com asteriscos indicam que estão incluídas no PPA e LOA 2022.


	COMARCA	Ano doação	Ano limite
1	AMPÉRE (em construção) **	2015	2017
2	ANTONINA	2012	2015
3	CAMPO MOURÃO **	2019	2028
4	CAMPO MOURÃO (Usina Fotovoltáica) **	2019	2029
5	CARLÓPOLIS **	2011	2024
6	CENTENÁRIO DO SUL **	2009	Sem prazo
7	CLEVELÂNDIA **	2021	Sem prazo
8	COLOMBO **	2008	Sem prazo
9	CORBÉLIA **	2014	2024
10	FAXINAL **	2020	Sem prazo
11	FRANCISCO BELTRÃO (em construção)	2017	Sem prazo
12	IPORÃ **	2019	Sem prazo
13	IRATI **	2020	Sem prazo
14	IRETAMA **	2020	Sem prazo
15	JAGUARIAÍVA **	2010	Sem prazo
16	JANDAIA DO SUL **	2018	Sem prazo
17	JOAQUIM TÁVORA	2015	2022/2025
18	LAPA	2009	Sem prazo
19	LOANDA **	2019	2025
20	MANDAGUAÇÚ	2010	2012
21	MANGUEIRINHA **	2019	Sem prazo
22	MARIALVA **	2011	2024
23	MARINGÁ **	2012	2032+20
24	NOVA AURORA **	2017	Sem prazo
25	PARANAVAÍ **	2018	Sem prazo
26	PEABIRÚ **	2011	Sem prazo
27	PONTA GROSSA **	2013	Sem prazo
28	PONTAL DO PARANÁ **	2019	Sem prazo

29	PRUDENTÓPOLIS **	2020	Sem prazo
30	QUEDAS DO IGUAÇÚ **	2019	Sem prazo
31	RIBEIRÃO DO PINHAL **	2009	Sem prazo
32	ROLÂNDIA	1998	2000
33	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA **	2018	Sem prazo
34	SÃO JERÔNIMO DA SERRA **	2019	Sem prazo
35	SÃO MATEUS DO SUL **	2020	Sem prazo
36	SENGÉS	2011	2013
37	TELÊMACO BORBA	2011	Sem prazo
38	TERRA RICA **	2018	Sem prazo
39	UNIÃO DA VITÓRIA **	2016	2024
40	URAÍ **	2009	Sem prazo
41	WENCESLAU BRAZ **	2018	Sem prazo

## 2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUM	MO IMOBILIÁRIO	<u> </u>	<u></u>	EMISSÃO		
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS C	08/07/2022					
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca /	/ nº varas judiciárias	na Comarca)		899		
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)	Io ,		/ F // / F	731		
		dice físico ABAIXO do dice físico ACIMA do		102 58		
	Idade média das c		indice lisico medio	26,0		
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB)				321.490,24		
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)				34.580,19		
AREA TOTAL DE IMOVEIS EM OUTROS USOS NAO JUDICIARIOS (cedidos a 3º e/ou sem uso)	OU SEM USO			34.367,38		
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis	de uso não judiciários)			390.437,81		
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)				193.034,93		
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	TIDD			583.472,74		
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS	TIJEN					
				637.630,59		
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS				128.193,64		
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURTIBA				197.843,75		
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA				963.667,98		
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS		D	45	316.207,55		
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU	J JÁ ELEITOS		15	96.212,74		
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CON	IFORME SISTE	MA HERMES				
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS				R\$ 760.826.100,17		
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES	R\$ 1.093.585.423,59					
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR						
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instru	istoma Hormos	R\$ 1.854.411.523,76				
OBS. Valor patrimornal depreciado e atdalizado, nos termos da institu	içao Noimativa II To	v2016, e comonne 3	isterna riennes			
NÚMERO DE	E EDIFICAÇÕE:	S DO TJPR				
1. EDIFICAÇÕ	DES EM COMARCA					
		EM USO		SEM USO OU		
FÓRUNS CENTRAIS		JUDICIÁRIO		OUTROS USOS		
FÓRUNS CENTRAIS  FÓRUNS ANTIGOS		160 2		0		
IMÓVEIS 2		13		46 11		
IMÓVEIS 3		8		4		
IMÓVEIS 4		6		1		
IMÓVEIS 5		4		0		
IMÓVEIS 6		1		0		
TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO INTERIOR	Α	194	С	62		
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de ma	agistrados ocupadas ou	não, imóveis cedidos, e	outros sem uso ou com uso	não judiciário)		
	IFICAÇÕES EM CU					
TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA	B	36				
PRÓPRIOS (TJPR)		3	-			
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ)		20				
LOCADOS AO TJPR		13				
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL)						
TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E AD	230					
TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXC	OS SEM USO)	(A+B+C)	292			
TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOAD	AS)		(D)	45		
TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOAD.	AS)		(D)	45		
TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOAD.  TOTAL GERAL DE UNIDA			(D) (A+B+C+D)	45 337		

#### IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE



#### IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO



## 3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)

Para maiores informações, ver Relatório de Ranqueamento do mês corrente.


Notas referenciais: mínimo 32 / máximo 2.648

RELATÓRIO RANQUEAMENTO DE COMARCAS							
	RANQL	JEAMEN <sup>®</sup>	TO NOS TERMOS DA	RESOLUÇÃO 114/2010 C	NJ	08/07/2022	
POSIÇÃO	COMARCAS	NOTA	SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL	HÁ OBRA/SERVIÇO EM ANDAMENTO?	HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO?	TERRENO DOADO?	
1	NOVA AURORA	32	MUNICÍPIO	EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 7143748	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO	
2	AMPÉRE	35	MUNICÍPIO	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO	
3	CENTENÁRIO DO SUL	50	MUNICÍPIO	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO	
4	COLOMBO	75	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO  ARQUITETÔNICO DEA  NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO	
5	JAGUARIAÍVA	84	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO	
6	MARINGÁ	118	ESTADO DO PARANÁ	EM PREPARAÇÃO LICITAÇÃO NOVO FÓRUM	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO	
7	BOCAIÚVA DO SUL	124	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	NÃO	
8	PONTAL DO PARANÁ	156	MUNICÍPIO	EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 7527696	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO	
9	PARANAGUÁ	156	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	PROPOSTO	
10	CORBÉLIA	160	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO	
11	IRATI	164	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO	TERRENO DOADO	
12	CLEVELÂNDIA	166	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO	
13	ANTONINA	176	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO	
14	MORRETES	183	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO	

			I		DROUTTO	
15	PARANAVAÍ	183	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ARQUITETÔNICO DEA NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
16	SANTO ANTÔNIO	184	TJPR	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE	TERRENO
10	DA PLATINA	10.	131 10	TANDA CONSTA	NOVO FÓRUM	DOADO
17	RIBEIRÃO DO	100	ESTADO DO	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE	TERRENO
17	PINHAL	190	PARANÁ	NADA CONSTA	NOVO FÓRUM	DOADO
	,		ESTADO DO		ESTUDO DE VIABILIDADE	
18	PIRAÍ DO SUL	191	PARANÁ	NADA CONSTA	NOVO FÓRUM	PROPOSTO
					PROJETO	
19	TELÊMACO BORBA	205	ESTADO DO	NADA CONSTA	ARQUITETÔNICO DEA	TERRENO
13	TELEWIACO BONDA	203	PARANÁ	NADA CONSTA	REFORMA E AMPLIAÇÃO	DOADO
	EDANICISCO.		55740000	ENA ORDA NOVO	REI ORIVIA E AIVIF EIAÇÃO	TERRENO
20	FRANCISCO	213	ESTADO DO	EM OBRA NOVO	NADA CONSTA	TERRENO
	BELTRÃO		PARANÁ	FÓRUM		DOADO
21	PIRAQUARA	213	ESTADO DO	NADA CONSTA	EXECUTIVO REFORMA E	PROPOSTO
			PARANÁ		AMPLIAÇÃO	
22	CENCÉC	224	ESTADO DO	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE	TERRENO
22	SENGÉS	221	PARANÁ	NADA CONSTA	NOVO FÓRUM	DOADO
			ESTADO DO		ESTUDO DE VIABILIDADE	TERRENO
23	URAÍ	221	PARANÁ	NADA CONSTA	NOVO FÓRUM	DOADO
					PROJETO	
24	UNIÃO DA VITÓRIA	225	ESTADO DO	NADA CONSTA		TERRENO
24	UNIAO DA VITORIA	225	PARANÁ	NADA CONSTA	ARQUITETÔNICO DEA	DOADO
					NOVO FÓRUM	
			ESTADO DO		PROJETO	TERRENO
25	PEABIRÚ	232	PARANÁ	NADA CONSTA	ARQUITETÔNICO	DOADO
			T AIVAIVA		PADRÃO II	DOADO
26	DITANICA	226	ESTADO DO	DEFORMA	NADA CONSTA	TERRENO
26	PITANGA	236	PARANÁ	REFORMA	NADA CONSTA	DOADO
			ESTADO DO			
27	JAGUAPITÃ	238	PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO
			ESTADO DO		EXECUTIVO NOVO	TERRENO
28	JANDAIA DO SUL	240	PARANÁ	REFORMA	FÓRUM	DOADO
					TOROW	DOADO
29	MANDAGUARÍ	242	ESTADO DO	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
			PARANÁ			
			ESTADO DO		PROJETO	
30	SARANDI	254	PARANÁ	NADA CONSTA	ARQUITETÔNICO DEA	NÃO
			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		REFORMA E AMPLIAÇÃO	
24	SÃO JOÃO DO	254	ESTADO DO	NADA CONSTI	NADA CONSTA	Não
31	TRIUNFO	261	PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
			ESTADO DO			
32	TEIXEIRA SOARES	268	PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
	CÂNDIDO DE		ESTADO DO			
33		276		NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO
	ABREU		PARANÁ			
34	PRUDENTÓPOUS	ENTÓPOLIS 291	ESTADO DO	NADA CONSTA	EXECUTIVO NOVO	TERRENO
34	PRUDENTÓPOLIS	281		INADA CONSTA	,	
34	PRUDENTÓPOLIS	281	PARANÁ	NADA CONSTA	FÓRUM	DOADO
34	PRUDENTÓPOLIS  SANTA MARIANA	281	PARANÁ ESTADO DO	NADA CONSTA	FÓRUM  NADA CONSTA	DOADO NÃO

36	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	282	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO  ARQUITETÔNICO DEA  REFORMA E AMPLIAÇÃO	PROPOSTO
37	MANDAGUAÇÚ	293	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
38	MARIALVA	296	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
39	PRIMEIRO DE MAIO	300	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	NADA CONSTA	NÃO
40	IPORÃ	302	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO

#### 4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

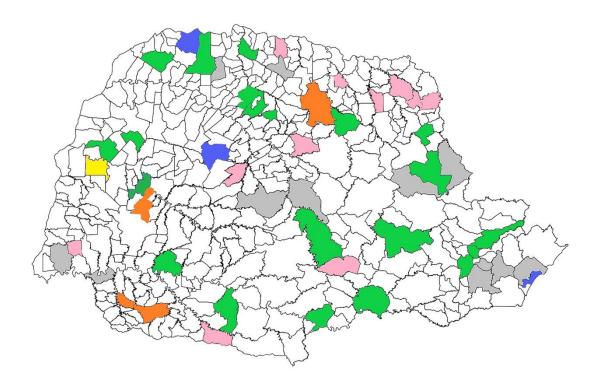

#### Obras em andamento

<u>Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal</u>

Ampére – Construção Novo Fórum

Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum

Corbélia – Construção Novo Fórum

#### Obras em recebimento

Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum

Curitiba – Sonorização plenário Anexo

#### Obras em licitação ou preparação de edital

Nova Aurora – Novo Fórum

Terra Rica – Novo Fórum

Pontal do Paraná – Novo Fórum

#### **Projetos complementares contratados**

Maringá – Projetos e Assessoramento – em recebimento

Curitiba – Centro Judiciário – Projetos e Assessoramento CJC

Colombo – Projetos e Assessoramento Novo Fórum

Ponta Grossa – Projetos e Assessoramento Novo Fórum

Campo Mourão, Paranavaí e União da Vitória – Projetos Novo Fórum

Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos - suspenso

Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos - suspenso

Jaguariaíva, Bocaiúva do Sul, Peabiru, Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, Wenceslau Braz - Projetos Novo Fórum

Jandaia do Sul, Quedas do Iguaçu, Colorado, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Loanda, Marialva – Projetos Novo Fórum

Campo Mourão – Usina Fotovoltaica – Projetos

#### Projetos complementares em contratação/preparação

Santo Antônio da Platina e Irati – Projetos Novo Fórum

Curitiba Sede Mauá – Usina Fotovoltaica

Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, Iretama, Carlópolis

#### Projetos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade

Terrenos em análise ou legalização de doação
Alto Paraná
Morretes
Piraí do Sul
Cândido de Abreu
Paranaguá
São José dos Pinhais
Capanema
Sengés
São Miguel do Iguaçu
Pitanga
Medianeira
Piraquara
Jaguapitã

#### 5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 13 AÇÕES

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas ações, obras e serviços de acessibilidade indicadas em amarelo.

#### COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE

COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO COR ROXA INDICA OBRA QUE INCLUI EXECUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL

	COMARCA	STATUS	OES	Observações	MOV. SEI
1	Almirante Tamandaré	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO	29/03/2022 Com DAR para esclarecimento quanto ao projeto. 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação		7479607
2	Capanema	ATUALIZANDO PROJETO		20/06/2022, Arquitetura alterando projeto. 16/07/2021, enviado para análise da DM 01/07/2022, Com DE para levantamento e contratação 21/06/2021, Com DE para levantamento e contratação	7807386

3	Curitiba - Descentralizado Sta Felicidade	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	06/11/2019	18/07/2022, atualizar seguro garantia. 08/04/2022 - Formalizado novo aditivo de preço e prazo com mais 45 dias para finalização. 18/02/2022 Formalizado novo aditivo de prazo com mais 45 dias para finalização	7923530
4	Curitiba - Tribunal do Juri	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 7887055	29/10/2020	11/07/2022, Recebimento provisório 15/03/2022 Formalizado aditivo de preço e prazo (30 dias) 14/02/2022 Em análise aditivo de preço e prazo (30 dias)	7899262
5	Faxinal	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado - com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	6043134
6	Imbituva	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/06 Com DE para levantamento e contratação	7904856
7	Mangueirinha	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação	5149922
8	Morretes	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	7907326
9	Quedas do Iguaçú	CONTRATAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO		22/06/2022, Encaminhado a Div de Projetos para contrtação de projeto elértico. 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação	7785846
10	Ribeirão Claro	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		24/03/2021 Com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	6204678
11	Santa Helena	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209	01/07/2020	26/01/2021 Recebimento Provisõrio 6016209 09/07/2020 Reforma contratada OS emitida 180 dias	7676019


			12/06/2020 Aguarda documentação da construtora	
12	União da Vitória - Fórum Central	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO	12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019	4713874
13	São Jerônimo da Serra	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO	03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação 03/12/2020 Finalizado projeto de arquitetura	7744110


#### 6. **DESEMBOLSOS TOTAIS**


No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R\$ 4.197.381,43 correspondentes a 12,63 % do valor inicialmente planejado de R\$ 33.237.617,58 para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

	Desembolso no mês do relatório	Desembolso acumulado no ano
Obras em execução ou em Recebimento	R\$ 3.310.585,84	R\$ 12.797.550,89
Proj. complementares	R\$ 1.613.677,81	R\$ 1.741.943,53
Manutenção e Atas	R\$ 917.860,39	R\$ 8.311.744,63
ACUMULADO ANUAL	R\$ 5.842.124,04	R\$ 21.239.484,03


#### 6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório)

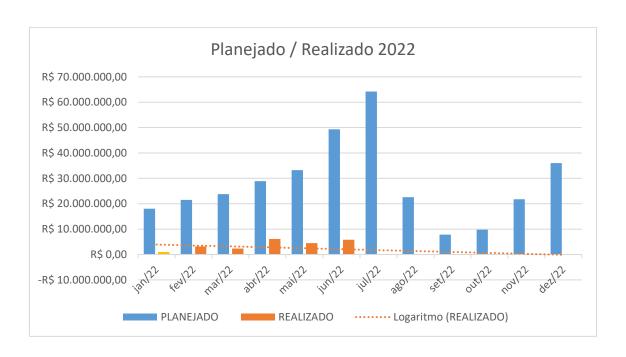

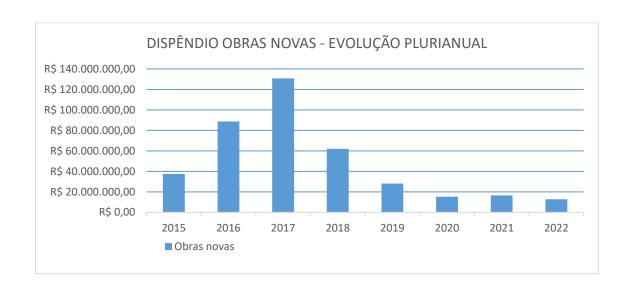

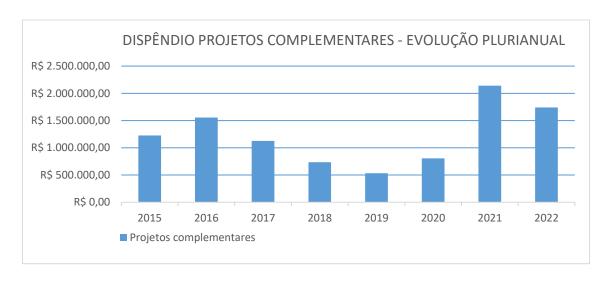



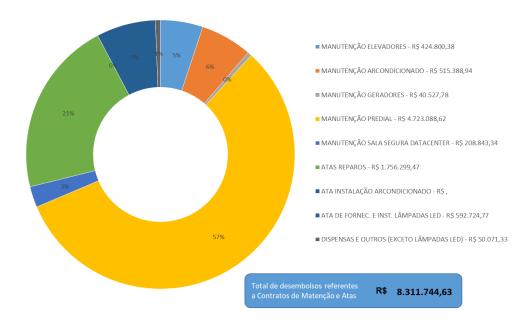

#### 7. CONTRATOS DE MANUTEÇÃO E ATAS

#### CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

- 7.1 Manutenção Elevadores
- 7.2 Manutenção Ar condicionado
- 7.3 Manutenção Geradores
- 7.4 Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)
- 7.5 Manutenção Sala Segura e Data Center
- 7.6 Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia
- 7.7 Ata de Instalação de Ar condicionado
- 7.8 Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor no valor de R\$ 1.994.820,36 e acumulado anual de R\$ 11.584.584,54, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

### **DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS:**

As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face à próximo esgotamento da vigência do contrato: verde (não necessita atenção), amarelo (final da vigência próximo) e vermelho (contrato vencido).

#### 7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 481.501,56
Regional Oeste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 117.597,36
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	04/11/2022	R\$ 154.415,75.

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 20.476,76
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 424.800,38



#### 7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado		Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV D	DE CLIMATIZAÇÃO	08/02/2023	R\$ 5.759.707,44
	LTDA			

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 515.388,94



Destino	Total de chamados	Finalizados		Abertos
Paraná total				
Chamados finalizados totais no mês (incluem chamados abertos em outros meses e		Dados	não	
		informados	Hau	
finalizados no mês do re	elatório)	iiiioiiiiauos		

#### 7.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, com fornecimento integral de peças.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-	18/08/2023	R\$ 81.055,56
	BREAKS E GERADORES - ME		

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 13.509,26
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 40.527,78



Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paraná total	Dados não informados		

#### 7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços.

Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Para relação das unidades por Regionais, ver Anexos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	05/04/2023	R\$ 12.213.699,88

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 883.874,37
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 4.723.088,62



TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência Maio/2022 fornecidos por DEA-DM)

#### Relação das unidades do contrato (Exceto regional 1)

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
CAMPO MOURÃO	Atestado	R\$ 8.540,83
CASCAVEL	Atestado	R\$ 15.781,83
CORNÉLIO PROCÓPIO	Atestado	R\$ 7.325,30
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 7.073,92
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 1.063,32
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 13.953,63
LONDRINA	Atestado	R\$ 21.279,02
MARINGÁ	Atestado	R\$ 20.730,12
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 6.434,43
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 4.518,92
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 6.852,31
TELÊMADO BORBA	Atestado	R\$ 7.082,59
UNIÃO DA VITÓRIA	Atestado	R\$ 2.034,03
13 UNIDADES	TOTAL:	R\$ 122.670,23

#### Relação das Cidades

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
Andirá	Atestado	R\$ 1.154,06
Apucarana	Atestado	R\$ 1.713,79
Arapongas	Atestado	R\$ 2.584,34
Arapoti	Atestado	R\$ 206,03
Assaí	Atestado	R\$ 5.011,90
Assis Chateaubriand	Atestado	R\$ 66,63
Bandeirantes	Atestado	R\$ 1.709,19
Barracão	Atestado	R\$ 1.096,85

Bela Vista do Paraíso	Atestado	R\$ 1.287,96
Cambará	Atestado	R\$ 2.861,07
Cambé	Atestado	R\$ 103,99
Campina da Lagoa	Atestado	R\$ 2.722,98
Cantagalo	Atestado	R\$ 1.262,23
Capanema	Atestado	R\$ 1.183,02
Capitão Leônidas Marques	Atestado	R\$ 821,64
Cascavel	Atestado	R\$ 5.405,53
Castro	Atestado	R\$ 623,20
Catanduvas	Atestado	R\$ 63,48
Chopinzinho	Atestado	R\$ 811,36
Cianorte	Atestado	R\$ 2.523,07
Cidade Gaúcha	Atestado	R\$ 1.029,96
Colorado	Atestado	R\$ 281,06
Congonhinhas	Atestado	R\$ 162,35
Corbélia	Atestado	R\$ 35,96
Cornélio Procópio	Atestado	R\$ 1.600,98
Coronel Vivida	Atestado	R\$ 441,77
Dois Vizinhos	Atestado	R\$ 727,90
Engenheiro Beltrão	Atestado	R\$ 835,29
Foz do Iguaçu	Atestado	R\$ 203,67
Franciso Beltrão	Atestado	R\$ 85,34
Goioerê	Atestado	R\$ 329,19
Grandes Rios	Atestado	R\$ 5.727,11
Guaíra	Atestado	R\$ 373,38
Guaraniaçu	Atestado	R\$ 284,33
Guarapuava	Atestado	R\$ 4.970,84
Ibiporã	Atestado	R\$ 884,48
Icaraíma	Atestado	R\$ 243,74
Imbituva	Atestado	R\$ 1.374,82
Ipiranga	Atestado	R\$ 983,86
Iporã	Atestado	R\$ 330,40
Iretama	Atestado	R\$ 248,94
Jandaia do Sul	Atestado	R\$ 460,94
Joaquim Távora	Atestado	R\$ 365,47
Loanda	Atestado	R\$ 259,14
Londrina	Atestado	R\$ 505,95
Mallet	Atestado	R\$ 468,93
Mamborê	Atestado	R\$ 720,69
Mandaguaçu	Atestado	R\$ 16,60
Mandaguari	Atestado	R\$ 159,57
Mangueirinha	Atestado	R\$ 348,47

Manoel Ribas	Atestado	R\$ 362,58
Marechal Cândido Rondon	Atestado	R\$ 5.862,04
Marialva	Atestado	R\$ 329,61
Marilândia do Sul	Atestado	R\$ 2.151,87
Maringá	Atestado	R\$ 15.760,39
Marmeleiro	Atestado	R\$ 209,83
Matelândia	Atestado	R\$ 894,32
Medianeira	Atestado	R\$ 859,65
Nova Aurora	Atestado	R\$ 74,76
Nova Esperança	Atestado	R\$ 1.471,71
Nova Londrina	Atestado	R\$ 1.020,89
Ortigueira	Atestado	R\$ 3.512,67
Palmas	Atestado	R\$ 165,72
Palmeira	Atestado	R\$ 134,75
Palmital	Atestado	R\$ 1.508,74
Palotina	Atestado	R\$ 505,74
Paraíso do Norte	Atestado	R\$ 2.947,26
Peabiru	Atestado	R\$ 189,18
Pérola	Atestado	R\$ 290,15
Pinhão	Atestado	R\$ 1.177,92
Pitanga	Atestado	R\$ 635,04
Ponta Grossa	Atestado	R\$ 414,02
Prudentópolis	Atestado	R\$ 1.916,49
Quedas do Iguaçu	Atestado	R\$ 227,49
Realeza	Atestado	R\$ 1.679,29
Rebouças	Atestado	R\$ 2.119,79
Reserva	Atestado	R\$ 1.383,23
Ribeirão Claro	Atestado	R\$ 4.574,50
Rolândia	Atestado	R\$ 101,26
Salto do Lontra	Atestado	R\$ 102,62
Santa Fé	Atestado	R\$ 604,67
Santa Helena	Atestado	R\$ 929,26
Santa Isabel do Ivaí	Atestado	R\$ 274,52
Santo Antônio da Platina	Atestado	R\$ 1.086,01
São Jerônimo da Serra	Atestado	R\$ 1.362,36
São João	Atestado	R\$ 765,28
São João do Ivaí	Atestado	R\$ 748,34
São João do Triunfo	Atestado	R\$ 526,77
São Mateus do Sul	Atestado	R\$ 276,59
Sengés	Atestado	R\$ 519,34
Sertanópolis	Atestado	R\$ 235,25
Siqueira Campos	Atestado	R\$ 352,07

105 CIDADES	TOTAL:	R\$ 122.670,23
Xambrê	Atestado	R\$ 255,93
Wenceslau Braz	Atestado	R\$ 164,54
Uraí	Atestado	R\$ 971,12
União da Vitória	Atestado	R\$ 907,12
Umuarama	Atestado	R\$ 187,76
Ubiratã	Atestado	R\$ 26,53
Tomazina	Atestado	R\$ 309,72
Tibagi	Atestado	R\$ 294,55
Terra Roxa	Atestado	R\$ 239,26
Terra Rica	Atestado	R\$ 365,54
Terra Boa	Atestado	R\$ 525,81
Telêmaco Borba	Atestado	R\$ 161,40
Teixeira Soares	Atestado	R\$ 323,55

Para maiores informações, ver Relatórios Divisionais da Divisão de Manutenção.

## Relatório Regional 1

Período considerado - Contrato EQS Engenharia — Maio/2022.

CIDADE	VALOR APROVADO
Almirante Tamandaré	R\$ 1.950,31
Antonina	R\$ -
Araucária	R\$ 2.106,37
Bocaiúva Do Sul	R\$ -
Campina Grande Do Sul	R\$ 29,73
Campo Largo	R\$ 517,21
Cerro Azul	R\$ -
Colombo	R\$ 1.554,27
Curitiba	R\$ 59.652,96
Fazenda Rio Grande	R\$ 2.479,83
Guaratuba	R\$ 19,57
Lapa	R\$ 2.603,42
Matinhos	R\$ -
Morretes	R\$ 210,24
Paranaguá	R\$ 9.737,94
Pinhais	R\$ 3.266,89
Piraquara	R\$ 394,18

Pontal Do Paraná	R\$ 241,30
Rio Branco do Sul	R\$ 18,13
Rio Negro	R\$ 2.190,18
São José dos Pinhais	R\$ 1.239,39
TOTAL MEDIÇÃO	R\$ 88.211,92
TOTAL ACUMULADO CONTRATO 2	R\$ 234.180,79
TOTAL ACUMULADO 2022*	R\$ 540.931,48

#### 82 Ordens de Serviço do tipo Preventivas foram atendidas no período.

PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – Maio/2022 (exceto Regional 1) DADOS NÃO FORNECIDOS.

#### 7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER


Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

Destino	Contratado		Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA	Ε	28/07/2023	R\$ 403.635,13
	ENERGIA LTDA			

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

Destino	Contratado		Vigência	Valor contrato	
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL	INFRAESTRUTURA	Ε	01/04/2023	R\$ 293.675,58
	ENERGIA LTDA				

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 19.689,32
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 265.259,62



#### 7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Regional Guarapuava	TAS EMPREENDIMENTOS	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
	IMOBILIÁRIOS LTDA		
Regional RMC e	JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Litoral			
Regional Cascavel	TAS EMPREENDIMENTOS	21/09/2021	R\$ 1.000.000,00
	IMOBILIÁRIOS LTDA		
Regional Francisco	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA	12/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Beltrão			
Regional Londrina	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	01/12/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Jacarezinho	TAS EMPREENDIMENTOS	04/08/2022	R\$ 1.000.000,00
	IMOBILIÁRIOS LTDA		
Regional Umuarama	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	29/09/2022	R\$ 1.500.000,00
Regional Ponta	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	04/08/2022	R\$ 2.000.000,00
Grossa			

Regional Maringá	COVIARTES	MATERIAIS	DE	03/05/2023	R\$ 1.000.000,00
	CONSTRUÇÃO	) LTDA			
Regional Curitiba	TAS	EMPREENDIMEN	TOS	25/03/2023	R\$ 1.500.000,00
	IMOBILIÁRIOS	S LTDA			

#### Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 12.612,21
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 1.756.299,47



## 7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

Destino	Contratado			Vigência	Valor máximo
Paraná total	ARBOM	COMÉRCIO	DE	23/06/2023	R\$ 1.200.000,00
	REFRIGERA	ÇÃO EIRELI			

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 0,00




Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paraná total	Dados não informados		

## 7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED

Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação	CONSTRUTORA MORAIS E	30/09/2022	R\$ 3.400.089,00
lâmpadas LED	LAGE LTDA EPP		

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 592.724,77
Desembolso acumulado total do contrato até o momento	R\$ 1.603.037,83



#### 8 ANEXO

#### 8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES - UNIDADES ATENDIDAS

## **REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS**

Almirante Tamandaré
Campina grande do sul
Campo largo
Curitiba - Álvaro ramos
Curitiba - anexo
Curitiba - ahú
Curitiba - boqueirão
Curitiba - cic
Curitiba - fazenda pública
Curitiba - f. Cível
Curitiba - f. Cível ii
Curitiba - mateus leme
Curitiba - mauá
Curitiba - je pinheirinho
Curitiba – rua da glória, 290
Curitiba – rua da glória, 362
Curitiba – rua da glória, 393
Curitiba - santa felicidade
Curitiba – vep
Curitiba – técnico residente
Guarapuava
Guaratuba
Lapa
Paranaguá
Paranaguá – jecc
Piraquara
Ponta grossa
Rio negro
São josé dos pinhais, v. Infância e juventude
São josé dos pinhais, v. Fazenda pública
Teixeira soares
União da vitória

União da vitória – v de família

## **REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS**

Assis chateaubriand
Capanema
Cascavel
Chopinzinho
Coronel vivida
Dois vizinhos
Foz do iguaçú
Francisco beltrão
Laranjeiras do sul
Marechal cândido rondon
Medianeira
Pato branco
Quedas do iguaçú
Santo antônio do sudoeste
São miguel do iguaçú
Toledo

#### **REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS**

Apucarana
Bela vista do paraíso
Cambé
Campo mourão
Cianorte
Congoinhas
Cornélio procópio
Cruzeiro do oeste
Engenheiro beltrão
Ibaiti
Ibiporã

Ivaiporã
Londrina – fórum cível
Londrina - vep
Marialva
Maringá – fórum principal
Maringá – juizado especial
Maringa – fórum novo
Porecatu
Santa fé
Santo Antônio da platina
Telêmaco Borba
Terra boa
Tibagi

# 8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS

## PARANÁ TOTAL

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS** Total: 3947

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado

Split Hi Wall 7.500Btu/h	17
Split Hi Wall 9.000Btu/h	198
Split Hi Wall 12.000Btu/h	322
Split Hi Wall 18.000Btu/h	788
Split Hi Wall 22.000Btu/h	52
Split Hi Wall 24.000Btu/h	521
Split Hi Wall 30.000Btu/h	346
Split Piso-Teto 12.000Btu/h	21
Split Piso-Teto 18.000Btu/h	24
Split Piso-Teto 24.000Btu/h	58
Split Piso-Teto 30.000Btu/h	36
Split Piso-Teto 36.000Btu/h	201
Split Piso-Teto 42.000Btu/h	5
Split Piso-Teto 48.000Btu/h	123

Split Piso-Teto 60.000Btu/h	148
•	
Split Cassete 18.000Btu/h	110
Split Cassete 24.000Btu/h	61
Split Cassete 30.000Btu/h	55
Split Cassete 36.000Btu/h	63
Split Cassete 48.000Btu/h	95
Split Cassete 60.000Btu/h	15
Split Built-in 30.000Btu/h	1
Split Built-in 48.000Btu/h	3
Split Built-in 60.000Btu/h	2
Janeleiro 2.500Btu/h	2
Janeleiro 7.500Btu/h	5
Janeleiro 10.000Btu/h	10
Janeleiro 12.000Btu/h	134
Janeleiro 15.000Btu/h	4
Janeleiro 18.000Btu/h	126
Janeleiro 19.000Btu/h	135
Janeleiro 20.000Btu/h	1
Janeleiro 21.000Btu/h	191
Janeleiro 30.000Btu/h	74
Cortina de Ar	36

# EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO CENTRAL**: Total de 28 sistemas

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba - álvaro ramos
Curitiba – anexo
Curitiba – centro judiciário
Curitiba – champagnat
Curitiba – mauá
Curitiba – palácio da justiça
Curitiba – pinheirinho
Curitiba – restaurante
Curitiba – tribunal do júri
Campo largo

Guaratuba
Guarapuava
Rio negro
Lapa
Laranjeiras do sul
Cascavel
Coronel vivida
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Pato branco
Toledo
Cambé
Engenheiro beltrão
Jacarezinho
Paraíso do norte
Santa fé
Terra boa
Marechal cândido rondon

# 8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS

## PARANÁ TOTAL

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

#### **Curitiba:**

Prédio Álvaro Ramos.
Palácio da Justiça.
Palácio da Justiça Anexo.
Sede Mauá.
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente.
Fórum Cível II.

#### **Outras Comarcas:**

Foz do Iguaçu.	
Londrina.	
Guarapuava.	

# 8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS

#### **REGIONAL GUARAPUAVA**

Cândido de abreu
Cantagalo
Guarapuava
Irati
Iretama
Ivaiporã
Laranjeiras do sul
Mallet
Manoel ribas
Palmital
Pinhão
Pitanga
Prudentópolis
União da vitória

## **REGIONAL RMC E LITORAL**

Araucária,
Almirante Tamandaré,
Antonina,
Bocaiúva do Sul,
Campina Grande do Sul,
Campo Largo,
Cerro Azul,
Colombo,
Fazenda Rio Grande,

Guaratuba,
Matinhos,
Morretes,
Paranaguá,
Pinhais,
Piraquara,
Pontal do Paraná,
Rio Branco do Sul,
São José dos Pinhais.

## **REGIONAL DE CASCAVEL**

Assis chateaubriand
Campina da lagoa
Capanema
Capitão leônidas marques
Cascavel
Catanduvas
Corbélia
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Guaraniaçu
Mamborê
Marechal cândido rondon
Matelândia
Medianeira
Nova aurora
Palotina
Quedas do iguaçu
Santa helena
São miguel do iguaçu
Toledo
Ubiratã

## **REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO**

Ampére
Barração
Chopinzinho
Clevelandia
Coronel vivida
Dois vizinhos
Francisco beltrão
Mangueirinha
Marmeleiro
Palmas
Pato branco
Realeza
Salto do lontra
Santo antônio do sudoeste
São joão

#### **REGIONAL DE LONDRINA**

Apucarana,
Arapongas
Assaí
Bela Vista do Paraíso
Cambé
Congonhinhas
Faxinal
Grandes Rios
Ibiporã
Londrina
Marilândia do Sul
Ortigueira
Primeiro de Maio
Rolândia

São Jerônimo da Serra
Sertanópolis
Uraí.

# 8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS

# Relação das unidades do contrato e respectivas Regionais (Sedes)

Unidade			Sede	Regional
Curitiba			Augusto Severo	I
Curitiba			Palácio da Justiça	
Curitiba			Mauá	
Curitiba			Centro Judiciário Ahú	
Curitiba			Barracão	
Ponta Grossa (	Ponta Gross	a)	Fórum da Comarca de Ponta Grossa	II
Ponta Grossa (	União da Vi	tória)	Fórum da Família e da Infância e Juventude	II
Guarapuava (G	iuarapuava)		Comarca de Guarapuava	Ш
Guarapuava (G	iuarapuava)		Comarca de Guarapuava	Ш
Francisco Beltr	ão (Pato Bra	anco)	Comarca de Pato Branco	IV
Francisco Beltr	ão (Pato Bra	anco)	Comarca de Pato Branco	IV
Londrina (Lond	lrina)		Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Londrina (Lond	lrina)		Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Londrina (Lond	lrina)		Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Cascavel (Foz o	lo Iguaçu)		Comarca de Foz do Iguaçú	V
Cascavel (Casc	avel)		Comarca de Cascavel	V
Cascavel (Casc	avel)		Comarca de Cascavel	V
Campo Mourã	o (Campo M	lourão)	Comarca de Campo Mourão	VI
Umuarama (Cr	uzeiro do O	este)	Comarca de Cruzeiro do Oeste	VII
Umuarama (Cr	uzeiro do O	este)	Comarca de Cruzeiro do Oeste	VII
Maringá (Mari	ngá)		Comarca de Maringá	VIII
Maringá (Mari	ngá)		Comarca de Maringá	VIII
Maringá (Mari	ngá)		Comarca de Maringá	VIII
Santo Antô	nio da	Platina	Comarca de Ribeirão Claro	X
Santo Antô	nio da	Platina	Comarca de Cornélio Procópio	X
Telêmaco		Borba	Comarca de Telêmaco Borba	ΧI

# Comarcas atendidas por Regional (Sede)

REGIONAL CURITIBA	UNIDADE
ALMIRANTE TAMANDARÉ	Fórum local
ANTONINA	Fórum local
ARAUCÁRIA	Fórum local
BOCAIÚVA DO SUL	Fórum local

CAMPINA GRANDE DO SUL	Fórum local
CAMPO LARGO	Fórum local
CERRO AZUL	Fórum local
COLOMBO	Fórum Central
COLOMBO	Juizados Especiais
COLOMBO	Arquivos gerais
COLOMBO	Fórum Cível
COLOMBO	Fórum da Família
COLOMBO	Arquivos
CURITIBA	Sede Álvaro Ramos
CURITIBA	Sede casa Álvaro Ramos 1
CURITIBA	Sede casa Álvaro Ramos 2
CURITIBA	Barracão Anita Garibaldi
CURITIBA	Sede Arquivo Pinhais
CURITIBA	Sede Arquivo São José dos
CURITIBA	Barracão Flávio Dallegrave
CURITIBA	Sede Lysimaco Ferreira da
CURITIBA	Centro de Educação Infantil
CURITIBA	Cetrans
CURITIBA	Cetrans - DETO
CURITIBA	Centro Judiciário de Curitiba
CURITIBA	Sede Cândido de Abreu
CURITIBA	Sede Pery Moreira
CURITIBA	Sede Rua da Glória 1
CURITIBA	Sede Rua da Glória 2
CURITIBA	Sede Rua da Glória 3
CURITIBA	Sede Nilo Peçanha
CURITIBA	Sede Ivo Leão
CURITIBA	Escola da Magistratura
CURITIBA	Fórum Cível 1 (Cândido de
CURITIBA	Fórum Cível 2 (Mateus Leme)
CURITIBA	Sede Mauá
CURITIBA	Sede Mauá 2 (Augusto Severo)
CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Fórum Descentralizado de
CURITIBA	Fórum Descentralizado do CIC
CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Fórum Descentralizado do Sítio
CURITIBA	Sede Mateus Leme
CURITIBA	Complexo do Palácio da Justiça
CURITIBA	Tribunal do Júri
CURITIBA	Sede Avenida Iguaçu
CURITIBA	Vara de Adolescentes
CURITIBA	Vara de Execuções Penais (João
FAZENDA RIO GRANDE	Fórum local
FAZENDA RIO GRANDE	Juizados Especiais
GUARATUBA	Fórum local

LAPA	Fórum local
MATINHOS	Fórum local
MORRETES	Fórum local
PARANAGUÁ	Fórum Central
PARANAGUÁ	Fórum Cível
PARANAGUÁ	Juizados Especiais
PARANAGUÁ	Arquivos gerais
PINHAIS	Fórum local
PIRAQUARA	Fórum Central
PIRAQUARA	Fórum Cível e Família
PONTAL DO PARANÁ	Fórum local
RIO BRANCO DO SUL	Fórum local
RIO NEGRO	Fórum local
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum Central
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum da Família
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Juizados Especiais
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum da Fazenda Pública

SEDE PONTA GROSSA	UNIDADE
CASTRO	Fórum local
IMBITUVA	Fórum local
IPIRANGA	Fórum local
JAGUARIAÍVA	Fórum local
PALMEIRA	Fórum local
PIRAÍ DO SUL	Fórum local
PONTA GROSSA	Fórum central
PONTA GROSSA	Sede Cejusc e arquivos
SENGÉS	Fórum local

SEDE UNIÃO DA VITÓRIA	UNIDADE
IRATI	Fórum local
IRATI	Juizados Especiais
MALLET	Fórum local
REBOUÇAS	Fórum local
SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Fórum local
SÃO MATEUS DO SUL	Fórum local
TEIXEIRA SOARES	Fórum local
UNIÃO DA VITÓRIA	Fórum central
UNIÃO DA VITÓRIA	Arquivos 1
UNIÃO DA VITÓRIA	Arquivos 2
UNIÃO DA VITÓRIA	Fórum da Família

SEDE TELÊMACO BORBA	UNIDADE
ARAPOTI	Fórum local
CÂNDIDO DE ABREU	Fórum local
CONGONHINHAS	Fórum local

CURIÚVA	Fórum local
IBAITI	Fórum local
ORTIGUEIRA	Fórum local
RESERVA	Fórum local
SÃO JERÔNIMO DA SERRA	Fórum local
TELÊMACO BORBA	Fórum central
TELÊMACO BORBA	Fórum da Família
TIBAGI	Fórum local

SEDE RIBEIRÃO CLARO	UNIDADE
CARLÓPOLIS	Fórum local
JACAREZINHO	Fórum local
JOAQUIM TÁVORA	Fórum local
RIBEIRÃO CLARO	Fórum local
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	Fórum local
SIQUEIRA CAMPOS	Fórum local
TOMAZINA	Fórum local
WENCESLAU BRAZ	Fórum local

SEDE CORNÉLIO PROCÓPIO	UNIDADE
ANDIRÁ	Fórum local
BANDEIRANTES	Fórum local
CAMBARÁ	Fórum local
CORNÉLIO PROCÓPIO	Fórum local
CORNÉLIO PROCÓPIO	Juizados Especiais
NOVA FÁTIMA	Fórum local
RIBEIRÃO DO PINHAL	Fórum local
SANTA MARIANA	Fórum local

SEDE LONDRINA	UNIDADE
APUCARANA	Fórum local
ARAPONGAS	Fórum local
ASSAÍ	Fórum local
BELA VISTA DO PARAÍSO	Fórum local
CAMBÉ	Fórum local
FAXINAL	Fórum local
GRANDES RIOS	Fórum local
GRANDES RIOS	Arquivos gerais
IBIPORÃ	Fórum local
JAGUAPITÃ	Fórum local
LONDRINA	Fórum local
LONDRINA	Fórum Criminal
MARILÂNDIA DO SUL	Fórum local
PORECATÚ	Fórum local
PRIMEIRO DE MAIO	Fórum local
PRIMEIRO DE MAIO	Uso geral forense

ROLÂNDIA	Fórum local
SERTANÓPOLIS	Fórum local
URAÍ	Fórum local

SEDE MARINGÁ	UNIDADE
ALTO PARANÁ	Fórum local
ASTORGA	Fórum local
CENTENÁRIO DO SUL	Fórum local
COLORADO	Fórum local
JANDAIA DO SUL	Fórum local
LOANDA	Fórum local
MANDAGUAÇÚ	Fórum local
MANDAGUARÍ	Fórum local
MARIALVA	Fórum local
MARIALVA	Uso geral forense
MARINGÁ	Fórum local
MARINGÁ	Arquivos gerais
MARINGÁ	Arquivos
MARINGÁ	Fórum Cível
MARINGÁ	Juizados Especiais
NOVA ESPERANÇA	Fórum local
NOVA LONDRINA	Fórum local
PARANACITY	Fórum local
PARANAVAÍ	Fórum local
SANTA FÉ	Fórum local
SARANDI	Fórum local
TERRA RICA	Fórum local

SEDE CRUZEIRO DO OESTE	UNIDADE
ALTO PIQUIRI	Fórum local
ALTÔNIA	Fórum local
ASSIS CHATEAUBRIAND	Fórum local
CIDADE GAÚCHA	Fórum local
CRUZEIRO DO OESTE	Fórum local
FORMOSA DO OESTE	Fórum local
GOIOERÊ	Fórum local
GUAÍRA	Fórum local
ICARAÍMA	Fórum local
IPORÃ	Fórum local
PALOTINA	Fórum local
PARAÍSO DO NORTE	Fórum local
PÉROLA	Fórum local
SANTA ISABEL DO IVAÍ	Fórum local
TERRA ROXA	Fórum local
UMUARAMA	Fórum local
XAMBRÊ	Fórum local

SEDE CAMPO MOURÃO	UNIDADE
BARBOSA FERRAZ	Fórum local
CAMPINA DA LAGOA	Fórum local
CAMPO MOURÃO	Fórum local
CIANORTE	Fórum local
CIANORTE	Juizados Especiais
ENGENHEIRO BELTRÃO	Fórum local
IRETAMA	Fórum local
IVAIPORÃ	Fórum local
MAMBORÊ	Fórum local
PEABIRÚ	Fórum local
SÃO JOÃO DO IVAÍ	Fórum local
TERRA BOA	Fórum local
UBIRATÃ	Fórum local

SEDE CASCAVEL	UNIDADE
CAPANEMA	Fórum local
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	Fórum local
CASCAVEL	Fórum local
CATANDUVAS	Fórum local
CORBÉLIA	Fórum local
GUARANIAÇÚ	Fórum local
MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Fórum local
MATELÂNDIA	Fórum local
NOVA AURORA	Fórum local
QUEDAS DO IGUAÇÚ	Fórum local
SANTA HELENA	Fórum local
TOLEDO	Fórum local

SEDE FOZ DO IGUAÇU	UNIDADE
FOZ DO IGUAÇÚ	Fórum local
MEDIANEIRA	Fórum local
SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	Fórum local

SEDE PATO BRANCO	UNIDADE
AMPÉRE	Fórum local
BARRACÃO	Fórum local
CHOPINZINHO	Fórum local
CLEVELÂNDIA	Fórum local
CORONEL VIVIDA	Fórum local
DOIS VIZINHOS	Fórum local
FRANCISCO BELTRÃO	Fórum local
MANGUEIRINHA	Fórum local
MARMELEIRO	Fórum local
PALMAS	Fórum local

PATO BRANCO	Fórum local
REALEZA	Fórum local
SALTO DO LONTRA	Fórum local
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	Fórum local
SÃO JOÃO	Fórum local

SEDE GUARAPUAVA	UNIDADE
CANTAGALO	Fórum local
GUARAPUAVA	Fórum local
LARANJEIRAS DO SUL	Fórum local
MANOEL RIBAS	Fórum local
PALMITAL	Fórum local
PINHÃO	Fórum local
PITANGA	Fórum local
PRUDENTÓPOLIS	Fórum local
PRUDENTÓPOLIS	Arquivos gerais
