TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



RELATÓRIO PLANO DE OBRAS MAIO/2022

SUMÁRIO

| 1. | PRI | NCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO. | 4 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| | 1.1 | OBRAS EM ANDAMENTO: <mark>4 OBRAS</mark> | 4 |
| | 1.2 | OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS | 6 |
| | 1.3 | OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – <mark>3 OBRAS</mark> | 6 |
| | 1.4 | PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 24 PROJETOS | 7 |
| | 1.5 | PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 4 PROJETOS | 12 |
| | 1.6 | PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA | 13 |
| | 1.7 | TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS | 13 |
| | 1.1 | TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS | 14 |
| 2. | REL | ATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR | 16 |
| 3. | REL | ATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES) | 18 |
| 4. | LOC | ALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 29 |
| 5. | AÇÕ | ES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: <mark>15 AÇÕES</mark> | 30 |
| 6. | DES | EMBOLSOS TOTAIS | 32 |
| | 6.1 EV | OLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório) | 33 |
| 7. | CON | ITRATOS DE MANUTEÇÃO E ATAS | 34 |
| | 7.1 | MANUTENÇÃO ELEVADORES | 35 |
| | 7.2 | MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO | 36 |
| | 7.3 | MANUTENÇÃO GERADORES | 37 |
| | 7.4 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 37 |
| | 7.5 | MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER | 41 |
| | 7.6 | ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA | 42 |
| | 7.7 | ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 43 |
| | 7.8 | DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED | 43 |
| 8 | ANE | хо | 45 |
| | 8.1 | MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS | 45 |
| | 8.2 | MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS | 46 |
| | 8.3 | MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS | 48 |
| | 8.4 | REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS | 48 |
| | 8.5 | MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS | 50 |

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 21/06/2022.

Observações:

- 1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado obras e projetos:
 - a. Todo dado indicado de *% financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento Econômico Financeiro.
 - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo.
- 2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
 - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como "em andamento" a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
 - Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS

| 1 LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL | Construção Bloco Criminal |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 62.624.349,34 |
| Contratado | SALVER CONSTRUTORA E |
| | INCORPORADORA LTDA |
| Emissão OES | março, 2020 |
| Data prevista conclusão | julho, 2022 |
| Prazo previsto execução (meses) | 27 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 26 |
| % fisico realizado | 26,77% |
| Medição realizada | 6ª / 20 |
| Medição requerida | 7 <u>ª</u> |
| % financeiro realizado consolidado | 33,95% |
| Saldo a pagar | R\$ 41.364.609,79 |
| % financeiro não consolidado (se houver) | |
| Termo de Recebimento | |
| Inauguração/Ocupação | |
| Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido f | ev/2020 realizado 6,75% |

| 2 | AMPÉRE - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | |
|---|------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 6.133.337,92 | |
| | Contratado | CONSTRUTORA GUILHI | ERME LTDA |
| | Emissão OES | outubro, 2019 | |
| | Data prevista conclusão | dezembro, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 25 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 31 | |
| | % físico realizado | 60,16% | |
| | Medição realizada | 11ª / 14 | |
| | Medição requerida | 11ª | |
| | % financeiro realizado consolidado | 58,82% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 2.525.703,95 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | Termo de Recebimento | | |
| | Inauguração/Ocupação | | |

| 3 | FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000 | Construção Fói | rum Novo | | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------|-------|---|
| | Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 40.872 | .133,96 | | |
| | Contratado | SALVER | CONSTRU | JTORA | Е |
| | | INCORPORADO | RA LTDA | | |
| | Emissão OES | outubro, 2 | 2020 | | |
| | Data prevista conclusão | agosto, 20 | 122 | | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 21 | | | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 19 | | | |
| | % fisico realizado | 22,75% | | | |
| | Medição realizada | 7ª / 18 | | | |

| Medição requerida | | |
|------------------------------------------|-------------------|--|
| % financeiro realizado consolidado | 23,50% | |
| Saldo a pagar | R\$ 31.267.691,91 | |
| % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| Termo de Recebimento | | |
| Inauguração/Ocupação | | |

| 4 CORBÉLIA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 9.378.308,06 | |
| Contratado | CONSTRUTORA GUILHERN | ME LTDA |
| Emissão OES | novembro, 2021 | |
| Data prevista conclusão | janeiro, 2023 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 13 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 6 | |
| % fisico realizado | 4,66% | |
| Medição realizada | 1ª / 13 | |
| Medição requerida | 2 <u>a</u> | |
| % financeiro realizado consolidado | 3,55% | |
| Saldo a pagar | R\$ 9.045.122,11 | |
| % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| Termo de Recebimento | | |
| Inauguração/Ocupação | | |

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:



1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.

| 1 BELA VISTA DO PARAÍSO | Construção Fórum Novo | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|
| Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 8.156.223,56 | | | |
| Contratado | CONSTRUTORA PROJET | O NOVO | LTDA | ١ |
| Emissão OES | maio, 2018 | | | |
| Data prevista conclusão | setembro, 2019 | | | |
| Prazo previsto execução (meses) | 16 | | | |
| | | FORA | DA | DATA |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 27 | PREVIS | TA | |
| % físico realizado | 100,00% | | | |
| % financeiro realizado consolidado | 100,00% | | | |
| Termo de Recebimento | | PROV. | 1 | Março, |
| | Provisório | 2020 | | |
| | Definitivo programado | sem pr | ograr | nação |
| Inauguração/Ocupação | ação/Ocupação janeiro, 2021 | | 1 | |
| Conclusão | | | | |

| 2 CURITIBA - PRÉDIO ANEXO | EM OBRA SONORIZAÇÃO PRÉDIO ANEXO | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 4.953.726,74 | | |
| Contratado | SEAL TELECOM COMER | CIO E SERVIÇOS DE | |
| | TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 4 | |
| Emissão OES | outubro, 2019 | | |
| Data prevista conclusão | maio, 2020 | | |
| Prazo previsto execução (meses) | 6 | | |
| | | FORA DA DATA | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 32 | PREVISTA | |
| % físico realizado | 100,00% | | |
| % financeiro realizado consolidado | 96,78% | | |
| Termo de Recebimento | | PROV. Outubro, | |
| | Provisório | 2021 | |
| | Definitivo programado | sem programação | |
| Inauguração/Ocupação | | outubro, 2021 | |
| Conclusão | | | |

1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 3 OBRAS

| 1 | NOVA AURORA - PADRÃO 1500 | Construção | Fórum Novo |
|---|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| | Valor máximo estimado licitação | | R\$ 10.662.652,24 |
| | Início do procedimento de preparação da licitação | | novembro, 2021 |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | | FINALIZADO |
| | Publicação do Edital | | FINALIZADO |
| | Homologação da Licitação | previsão | FINALIZADO |
| | Assinatura do Contrato | previsão | FINALIZADO |
| | Fase atual | | aguardando OS |

| 2 | TERRA RICA - PADRÃO 1500 | Construção | Fórum Novo |
|---|---------------------------------------------|------------|-------------------|
| | Valor máximo estimado licitação | | R\$ 10.500.000,00 |
| | Início do procedimento de preparação da lic | itação | dezembro, 2021 |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | | FINALIZADO |
| | Publicação do Edital | | FINALIZADO |
| | Homologação da Licitação | previsão | junho, 2022 |
| | Assinatura do Contrato | previsão | julho, 2022 |
| | Fase atual | | Em licitação |

| 3 | PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500 | Construção | Fórum Novo |
|---|---------------------------------------------|------------|------------------------|
| | Valor máximo estimado licitação | | R\$ 10.500.000,00 |
| | Início do procedimento de preparação da lic | itação | março, 2022 |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | | FINALIZADO |
| | Publicação do Edital | | FINALIZADO |
| | Homologação da Licitação | previsão | julho, 2022 |
| | Assinatura do Contrato | previsão | julho, 2022 |
| | Fase atual | | Em licitação (deserta) |

1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 24 PROJETOS

| 1 MARINGÁ - PROJETOS | Construção Fórum Novo | |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 899.994,58 | |
| | GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJE | |
| Contratado | E GERENCIAMENTO DE OB | RAS LTDA |
| Emissão OES | outubro, 2018 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 41 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 44 | |
| Previsão de conclusão | março, 2022 | |
| % físico realizado | Fases previstas | |
| | Fases recebidas | |
| % financeiro realizado consolidado | 93,61% | |
| Saldo a pagar | R\$ 57.548,84 | |
| % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | | |
| MARINGÁ - ASSESSORAMENTO | Valor do contrato | % realizado |
| | R\$ 199.633,89 | 93,75% |

| 2 | CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS | Construção CJC | |
|---|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 4.981.060,31 | |
| | Contratado | PJJ MALUCELLI ARQUI | TETURA LTDA |
| | Emissão OES | junho, 2018 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 54 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 48 | |
| | Previsão de conclusão | dezembro, 2022 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 6 |
| | | Fases recebidas | 1 |

| % financeiro realizado consolidado | 24,55% |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Saldo a pagar | R\$ 3.758.374,13 |
| % financeiro não consolidado (se houv | r) |
| EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRA |) |
| | |
| CURITIBA - CENTRO JU | DICIÁRIO |
| ASSESSORAMENTO | Valor do contrato % realizado |
| | R\$ 901.144,22 26,97% |

| 3 | COLOMBO - PROJETOS | Construção Fórum Novo | |
|---|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 457.187,55 | |
| | | SOBE SERVIÇOS, | |
| | | OBRAS E | |
| | | EMPREENDIMENTOS | |
| | Contratado | LTDA. ME | |
| | Emissão OES | dezembro, 2019 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 36 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 30 | |
| | Previsão de conclusão | dezembro, 2022 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 5 |
| | | Fases recebidas | 2 |
| | % financeiro realizado consolidado | 26,74% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 334.948,70 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO AMBIENTAL | | |
| | COLOMBO - ASSESSORAMENTO | Valor do contrato | % realizado |
| | CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO | R\$ 114.800,00 | 20,00% |

| 4 | PONTA GROSSA - PROJETOS | Construção Fórum Novo | |
|---|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 784.739,75 | |
| | | ENAR ENGENHARIA E | ARQUITETURA |
| | Contratado | LTDA | |
| | Emissão OES (reinicio de contrato) | outubro, 2020 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 21 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 20 | |
| | Previsão de conclusão | julho, 2022 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 5 |
| | | Fases recebidas | 2 |
| | % financeiro realizado consolidado | 20,00% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 627.791,80 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | | | |
| | PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO | Valor do contrato | % realizado |
| | | R\$ 164.800,00 | 7,00% |

| CAMPO MOURÃO, PARANAVAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000 | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Valor do Contrato (incluídos aditivos) R\$ 447.447,00 | | | |
| Contratado | PROJETARE ENGENHA | ENHARIA LTDA-ME | |
| Emissão OES | julho, 2020 | | |
| % físico realizado | Fases previstas | 13 | |
| | Fases recebidas | 3 | |

| % financeiro realizado consolidado | 24,47% |
|------------------------------------------|----------------|
| Saldo a pagar | R\$ 337.934,35 |
| % financeiro não consolidado (se houver) | 39,47% |

| 5 | CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000 | Construção Fórum Novo | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | Emissão OES | julho, 2020 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 20 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 23 | |
| | Previsão de conclusão | março, 2022 | |
| 6 | PARANAVAÍ - PADRÃO 10.000 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2020 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 22 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 23 | |
| | Previsão de conclusão | maio, 2022 | |
| 7 | UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2020 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 28 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 23 | |
| | Previsão de conclusão | novembro, 2022 | |

| NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚV | <u> </u> | • |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERR FÓRUM PADRÃO 1800 | A, MANGUEIKINHA, WENCESLAU | J RKAZ – NOVO |
| Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 397.624,71 | |
| Contratado | JCASTRO&PERTSCHI E URBANISMO LTDA-ME | ARQUITETURA |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| % físico realizado | Fases previstas | 34 |
| | Fases recebidas | 5 |
| % financeiro realizado consolidado | 65,84% | |
| Saldo a pagar | R\$ 135.831,80 | |
| % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| NOVA AURORA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 9 | • |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 | |
| Previsão de conclusão | dezembro, 2021 | |
| 8 JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 16 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 15 | |
| Previsão de conclusão | julho, 2022 | |
| 9 BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500 | Construção Novo Fórum | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 17 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 15 | |
| Previsão de conclusão | agosto, 2022 | |
| 10 PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 11 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 13 | |
| | | |

| Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 | |
|----------------------------------------|-----------------------|--|
| 11 TERRA RICA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 11 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 13 | |
| Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 | |
| 12 PEABIRÚ - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 15 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 15 | |
| Previsão de conclusão | junho, 2022 | |
| 13 IPORÃ - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 15 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 15 | |
| Previsão de conclusão | junho, 2022 | |
| 14 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 16 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 15 | |
| Previsão de conclusão | julho, 2022 | |
| 15 MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 17 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 15 | |
| Previsão de conclusão | agosto, 2022 | |
| 16 WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo | |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 16 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 15 | |
| Previsão de conclusão | julho, 2022 | |

| | JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLO SUL, LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM P | | D MATEUS DO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 208.999,00 | |
| | Contratado | PROJETARE ENGENHA | RIA LTDA-ME |
| | Emissão OES | julho, 2021 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 10 |
| | | Fases recebidas | 1 |
| | % financeiro realizado consolidado | 9,85% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 188.412,60 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| 17 | JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 9 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 11 | |
| | Previsão de conclusão | abril, 2022 | |
| 18 | PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | _ |
| | Emissão OES | julho, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 12 | |

| | Prazo decorrido de execução (meses) | 11 | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | Previsão de conclusão | julho, 2022 | |
| ١9 | QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 10 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 11 | |
| | Previsão de conclusão | maio, 2022 | |
| 0 | LOANDA - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 11 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 11 | |
| | Previsão de conclusão | junho, 2022 | |
| 1 | MARIALVA - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 12 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 11 | |
| | Previsão de conclusão | julho, 2022 | |
| 2 | SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 13 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 11 | |
| | Previsão de conclusão | agosto, 2022 | |
| 23 | COLORADO - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 11 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 11 | |
| | Previsão de conclusão | junho, 2022 | |

| 24 | CAMPO MOURÃO | Usina Fotovoltáica | |
|----|------------------------------------------|--------------------|---|
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 0,00 | |
| | | | |
| | Contratado | ST ELETRICIDADE | |
| | Emissão OES | outubro, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 4 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 8 | |
| | Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 3 |
| | | Fases recebidas | 0 |
| | % financeiro realizado consolidado | #DIV/0! | |
| | Saldo a pagar | #DIV/0! | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | #DIV/0! | |

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:



1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 4 PROJETOS

| 1 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PADRÃO 5000 | PRAZO OK | | |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|----------|--|
| 1 | | | ALERTA | |
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 100.000,00 | ATRASADO | |
| | Início do procedimento de preparação da contratação | | INICIADO | |
| | Prazo estimado homologação da contratação | | Suspenso | |
| | Prazo estimado emissão OES | | Suspenso | |
| | Prazo estimado conclusão dos projetos | | Suspenso | |
| | Fase ou localização atual | | | |
| | DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTA | ARES | | |

| 2 | IRATI - PADRÃO 5000 | Construção Fórum Novo | PRAZO OK | | |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------|--|--|
| 2 | | | ALERTA | | |
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 100.000,00 | ATRASADO | | |
| | Início do procedimento de preparação da contratação | | | | |
| | Prazo estimado homologação da contratação | Suspenso | | | |
| | Prazo estimado emissão OES | Suspenso | | | |
| | Prazo estimado conclusão dos projetos | Suspenso | | | |
| | Fase ou localização atual | | | | |
| | DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES | | | | |

| 2 | CURITIBA - SEDE MAUÁ | Usina Fotovoltáica | PRAZO OK | |
|---|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--|
| 3 | | | ALERTA | |
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 23.485,00 | ATRASADO | |
| | Início do procedimento de preparação da licitação | | | |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | | | |
| | Prazo estimado publicação do Edital | | PUBLICADO | |
| | Prazo estimado homologação da licitação | | HOMOLOGADO | |
| | Prazo estimado emissão OES | junho, 2022 | | |
| | Fase ou localização atual | | | |
| | DCCO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | | | |

| | CENTENÁRIO DO SUL, RIBEIRÃO DO PINH | PRAZO OK | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|
| 4 | FAXINAL, JOAQUIM TÁVORA, IRETAMA E CARLÓPOLIS - NOVO FÓRUM PADRÃO 1500 | | ALERTA | |
| | Valor máximo estimado licitação | ATRASADO | | |
| | Início do procedimento de preparação da licitação | | | |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | | junho, 2022 | |
| | Prazo estimado publicação do Edital | junho, 2023 | | |
| | Prazo estimado homologação da licitação | | julho, 2022 | |
| | Prazo estimado emissão OES | agosto, 2022 | | |
| | Fase ou localização atual | | | |
| | DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES | | | |

1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA

No período não foram elaborados projetos arquitetônicos específicos para obras novas e/ou estudos de viabilidade.

1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS

Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de *status* nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno em curso, exceto pelo início do procedimento de oferta/vistoria de área na Comarca de Jaguapitã.

| CON | MARCA | EXPEDIENTE | STATUS | OBSERVAÇÕES | MOV. SEI |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | ALTO PARANÁ | 0044842-67.2015 | SUSPENSO. AGUARDA POSIÇÃO DA COMARCA | TERR. CONSIDERADO INADEQUADO. SUGERIDO COMARCA BUSCA DE NOVAS OPÇÕES AGUARDA POSICIONAMENTO DA COMARCA | 7159920 |
| 2 | MORRETES | 0065613-61.2018 | ELEITO | AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 11/2014 | 7649592 |
| 3 | PIRAÍ DO SUL | 0065866-15.2019 | ELEITO | DESPACHO DE ELEIÇAO ASSINADO, ENVIADO À COMARCA PARA FORMALIZAR DOAÇÃO JUNTAMENTE COM A PREFEITURA | 7158450 |
| 4 | CÂNDIDO DE ABREU | 0017074-64.2018 | EM ANÁLISE | JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, AGUARDA ANÁLISE DA ARQUITETURA DESDE 07/2020 | 7398511 |
| 5 | PARANAGUÁ | 0083854-54.2016 | ELEITO | AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 04/2018 | 2935335 |
| 6 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0055920-19.2019 | EM ANÁLISE | OFICIADA PREFEITURA PARA INFORMAR SE MANTÉN-SE A PROPOSTA DA DOAÇÃO. | 7667742 |
| 7 | CAPANEMA | 0026468-61.2019 | ELEITO | AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 11/2020 TRATATIVAS PARA PERMUTA SENDO REALIZADAS EM GRAU DE SECRETÁRIA DO TJPR AGUARDA INFORMAÇÃO DO DP | 7084627 |

| 8 | SENGÉS | 0095784-64.2019 | EM ANÁLISE | JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 08/2020 | 5484053 |
|----|-------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ | 0061298-53.2019 | EM ANÁLISE | JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 12/2020 | 5898310 |
| 10 | PITANGA | 0086215-39.2019 | EM ANÁLISE | EMITIDO RELATÓRIO DE VISTORIA, A SER ENCAMINHADO À ARQUITETURA | 7398458 |
| 11 | MEDIANEIRA | 0053483-05.2019 | EM ANÁLISE | NA ENGENHARIA PARA VISTORIAR NOVA ÁREA OFERTADA | 7675968 |
| 12 | PIRAQUARA | 0080776-47.2019 | EM ANÁLISE | JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA E PELA ARQUITETURA, AGUARDA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELA DIREÇÃO DO FÓRUM (MATRÍCULA E OFÍCIO DOADOR) | 6366887 |
| 13 | JAGUAPITÃ | 0075981-27.2021 | EM ANÁLISE | JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA ENCAMINHADO A DIV ARQUITETURA | 7745591 |

1.1 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS

No período, não houve alteração na planilha de terrenos doados e regularizados. Comarcas com asteriscos indicam que estão incluídas no PPA e LOA 2022.


| | COMARCA | Ano doação | Ano limite |
|----|--------------------------------------|------------|------------|
| 1 | AMPÉRE (em construção) ** | 2015 | 2017 |
| 2 | ANTONINA | 2012 | 2015 |
| 3 | CAMPO MOURÃO ** | 2019 | 2028 |
| 4 | CAMPO MOURÃO (Usina Fotovoltáica) ** | 2019 | 2029 |
| 5 | CARLÓPOLIS ** | 2011 | 2024 |
| 6 | CENTENÁRIO DO SUL ** | 2009 | Sem prazo |
| 7 | CLEVELÂNDIA ** | 2021 | Sem prazo |
| 8 | COLOMBO ** | 2008 | Sem prazo |
| 9 | CORBÉLIA ** | 2014 | 2024 |
| 10 | FAXINAL ** | 2020 | Sem prazo |
| 11 | FRANCISCO BELTRÃO (em construção) | 2017 | Sem prazo |

| 12 | IPORÃ ** | 2019 | Sem prazo |
|----|-----------------------------|------|-----------|
| 13 | IRATI ** | 2020 | Sem prazo |
| 14 | IRETAMA ** | 2020 | Sem prazo |
| 15 | JAGUARIAÍVA ** | 2010 | Sem prazo |
| 16 | JANDAIA DO SUL ** | 2018 | Sem prazo |
| 17 | JOAQUIM TÁVORA | 2015 | 2022/2025 |
| 18 | LAPA | 2009 | Sem prazo |
| 19 | LOANDA ** | 2019 | 2025 |
| 20 | MANDAGUAÇÚ | 2010 | 2012 |
| 21 | MANGUEIRINHA ** | 2019 | Sem prazo |
| 22 | MARIALVA ** | 2011 | 2024 |
| 23 | MARINGÁ ** | 2012 | 2032+20 |
| 24 | NOVA AURORA ** | 2017 | Sem prazo |
| 25 | PARANAVAÍ ** | 2018 | Sem prazo |
| 26 | PEABIRÚ ** | 2011 | Sem prazo |
| 27 | PONTA GROSSA ** | 2013 | Sem prazo |
| 28 | PONTAL DO PARANÁ ** | 2019 | Sem prazo |
| 29 | PRUDENTÓPOLIS ** | 2020 | Sem prazo |
| 30 | QUEDAS DO IGUAÇÚ ** | 2019 | Sem prazo |
| 31 | RIBEIRÃO DO PINHAL ** | 2009 | Sem prazo |
| 32 | ROLÂNDIA | 1998 | 2000 |
| 33 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA ** | 2018 | Sem prazo |
| 34 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA ** | 2019 | Sem prazo |
| 35 | SÃO MATEUS DO SUL ** | 2020 | Sem prazo |
| 36 | SENGÉS | 2011 | 2013 |
| 37 | TELÊMACO BORBA | 2011 | Sem prazo |
| 38 | TERRA RICA ** | 2018 | Sem prazo |
| 39 | UNIÃO DA VITÓRIA ** | 2016 | 2024 |
| 40 | URAÍ ** | 2009 | Sem prazo |
| 41 | WENCESLAU BRAZ ** | 2018 | Sem prazo |


2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

| RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--|--|
| QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CO | 13/06/2022 | | | | | |
| | | | | | | |
| ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / | nº varas judiciárias | na Comarca) | | 899 | | |
| NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento) | Compress som ins | lice físico ABAIXO do | índias física mádia | 731 102 | | |
| | | lice físico ACIMA do | | 58 | | |
| | Idade média das c | | | 26,0 | | |
| ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB) | | | | 321.490,24 | | |
| ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO | | | | | | |
| (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º) | | | | 34.580,19 | | |
| AREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS ((cedidos a 3º e/ou sem uso) | OU SEM USO | | | 34.367,38 | | |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis | de uso não judiciários) | | | 390.437,81 | | |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos) | | | | 193.034,93 | | |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA | T IDD | | | 583.472,74 | | |
| ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS | IJFK | | | 637.630,59 | | |
| ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS | | | | 128.193,64 | | |
| ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA | | | | 197.843.75 | | |
| | | | | | | |
| ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA | | | | 963.667,98 | | |
| NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS | | D | 45 | 316.207,55 | | |
| NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU | JÁ ELEITOS | | 15 | 96.212,74 | | |
| VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CON | FORME SISTE | MA HERMES | | | | |
| VALOR PATRIMONIAL TERRENOS | | | | R\$ 760.826.100,17 | | |
| VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES | | | | R\$ 1.093.585.423,59 | | |
| VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO T | OTAL TJPR | | | R\$ 1.854.411.523,76 | | |
| OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instruç | ção Normativa nº 16 | /2018, e conforme Si | stema Hermes | | | |
| 4 | EDIFICAÇÕE | | | | | |
| 1. EDIFICAÇÕ | ES EM COMARCA | S DO INTERIOR EM USO | l | SEM USO OU | | |
| | | JUDICIÁRIO | | OUTROS USOS | | |
| FÓRUNS CENTRAIS | | 160 | | 0 | | |
| FÓRUNS ANTIGOS | | 2 | | 46 | | |
| IMÓVEIS 2 | | 13 | | 11 | | |
| IMÓVEIS 3 | | 8 | | 4 | | |
| IMÓVEIS 4 | | 6 | | 1 | | |
| IMÓVEIS 5 | | 4 | | 0 | | |
| IMÓVEIS 6 | | 1 | | 0 | | |
| TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO INTERIOR | Α | 194 | С | 62 | | |
| obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de ma | | | outros sem uso ou com uso | não judiciário) | | |
| 2. EDI | FICAÇÕES EM CU | RITIBA | | | | |
| TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA | В | 36 | | | | |
| PRÓPRIOS (TJPR): | | 3 20 | | | | |
| PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ): LOCADOS AO TJPR: | | | | | | |
| PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL): | | <u> </u> | | | | |
| TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADI | 230 | | | | | |
| TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXC | 292 | | | | | |
| TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADA | TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO) (A+B+C) TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS) (D) | | | | | |
| | DEG | | (A - D - C - D) | 227 | | |
| TOTAL GERAL DE UNIDA | mE9 | | (A+B+C+D) | 337 | | |

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE



IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO



3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)

Para maiores informações, ver Relatório de Ranqueamento do mês corrente. Notas referenciais: mínimo 32 / máximo 2.648

| | ANQUEAMENTO DE ITO NOS TERMOS D | |) 114/2010 CN | 11 | | EMISS ÃO 13/06/ 2022 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| POSIÇÃO RANQUEAME NTO | COMARCAS | NOTA REFERENCI AL | SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL | HÁ OBRA/SERVI ÇO EM ANDAMENT O? | HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO? | TERRE NO DOAD O? |
| 1 | NOVA AURORA | 32 | MUNICÍPIO | EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 7143748 | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 2 | AMPÉRE | 35 | MUNICÍPIO | EM OBRA NOVO FÓRUM | NADA CONSTA | TERRE NO DOAD O |
| 3 | CENTENÁRIO DO SUL | 50 | MUNICÍPIO | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 4 | COLOMBO | 75 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | PROJETO ARQUITETÔNI CO DEA NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 5 | JAGUARIAÍVA | 84 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 6 | MARINGÁ | 118 | ESTADO DO PARANÁ | EM PREPARAÇÃ O LICITAÇÃO NOVO FÓRUM | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 7 | BOCAIÚVA DO SUL | 124 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | NÃO |
| 8 | PONTAL DO PARANÁ | 156 | MUNICÍPIO | EM PREPARAÇÃ O LICITAÇÃO DA OBRA TRP 7527696 | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 9 | PARANAGUÁ | 156 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | PROPO STO |
| 10 | CORBÉLIA | 160 | ESTADO DO PARANÁ | EM OBRA NOVO FÓRUM | NADA CONSTA | TERRE NO |

| | | | | | | DOAD O |
|----|-----------------------------|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 11 | IRATI | 164 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO | TERRE NO DOAD O |
| 12 | CLEVELÂNDIA | 166 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 13 | ANTONINA | 176 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 14 | MORRETES | 183 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | PROPO STO |
| 15 | PARANAVAÍ | 183 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO DEA NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 16 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 184 | TJPR | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 17 | RIBEIRÃO DO PINHAL | 190 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 18 | PIRAÍ DO SUL | 191 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | PROPO STO |
| 19 | TELÊMACO BORBA | 205 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO DEA REFORMA E AMPLIAÇÃO | TERRE NO DOAD O |
| 20 | FRANCISCO BELTRÃO | 213 | ESTADO DO PARANÁ | EM OBRA NOVO FÓRUM | NADA CONSTA | TERRE NO DOAD O |
| 21 | PIRAQUARA | 213 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO | PROPO STO |
| 22 | SENGÉS | 221 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |

| 23 | URAÍ | 221 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
|----|-------------------------|-----|---------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 24 | UNIÃO DA VITÓRIA | 225 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO DEA NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 25 | PEABIRÚ | 232 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 26 | PITANGA | 236 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | TERRE NO DOAD O |
| 27 | JAGUAPITÃ | 238 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | PROPO STO |
| 28 | JANDAIA DO SUL | 240 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 29 | MANDAGUARÍ | 242 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 30 | SARANDI | 254 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO DEA REFORMA E AMPLIAÇÃO | NÃO |
| 31 | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 261 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 32 | TEIXEIRA SOARES | 268 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 33 | CÂNDIDO DE ABREU | 276 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | PROPO STO |
| 34 | PRUDENTÓPOLIS | 281 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 35 | SANTA MARIANA | 282 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 36 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 282 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | PROJETO ARQUITETÔNI CO DEA | PROPO STO |

| | | | | | REFORMA E AMPLIAÇÃO | |
|----|--------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 37 | MANDAGUAÇÚ | 293 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 38 | MARIALVA | 296 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 39 | PRIMEIRO DE MAIO | 300 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 40 | IPORÃ | 302 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 41 | TERRA RICA | | ESTADO DO PARANÁ | EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 7405789 | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 42 | ALTO PARANÁ 321 | | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | PROPO STO |
| 43 | CAPANEMA | 326 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | PROPO STO |
| 44 | LONDRINA | 329 | ESTADO DO PARANÁ | EM OBRA BLOCO CRIMINAL | NADA CONSTA | NÃO |
| 45 | FAXINAL | 335 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 46 | QUEDAS DO IGUAÇÚ | 345 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 47 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA | 348 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 48 | BARBOSA FERRAZ | 361 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 49 | LOANDA | 366 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |

| 50 | SÃO MATEUS DO SUL | 367 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
|----|-------------------------|-----|---------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 51 | COLORADO | 369 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | NÃO |
| 52 | ALTO PIQUIRI | 369 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | NÃO |
| 53 | PONTA GROSSA | 377 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNI CO DEA NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 54 | IRETAMA | 379 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 55 | NOVA ESPERANÇA | 395 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | EXECUTIVO AMPLIAÇÃO FINALIZADO | NÃO |
| 56 | CARLÓPOLIS | 396 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 57 | CAMPO MOURÃO | 397 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 58 | MARILÂNDIA DO SUL | 405 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 59 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ | 405 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | PROPO STO |
| 60 | MANGUEIRINHA | 410 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 61 | UBIRATÃ | 415 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 62 | NOVA LONDRINA | 431 | TJPR | REFORMA | NADA CONSTA | NÃO |
| 63 | CURIÚVA | 434 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |

| 64 | GUAÍRA | 440 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | EXECUTIVO REFORMA FINALIZADO | NÃO |
|----|-------------------------|-----|---------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 65 | JOAQUIM TÁVORA | 444 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRE NO DOAD O |
| 66 | ARAPONGAS | 452 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 67 | SANTA ISABEL DO IVAÍ | 453 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 68 | CIANORTE | 454 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 69 | PINHÃO | 474 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 70 | UMUARAMA | 489 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 71 | MAMBORÊ | 497 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 72 | RIO BRANCO DO SUL | 498 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 73 | BANDEIRANTES | 517 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 74 | ROLÂNDIA | 520 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | TERRE NO DOAD O |
| 75 | MEDIANEIRA | 525 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | PROPO STO |
| 76 | RESERVA | 527 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 77 | APUCARANA | 534 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 78 | ARAUCÁRIA | 545 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 79 | GRANDES RIOS | 563 | TJPR | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |

| 80 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 569 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
|----|------------------------|-----|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 81 | MANOEL RIBAS | 579 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | PROJETO ARQUITETÔNI CO DEA REFORMA E AMPLIAÇÃO | NÃO |
| 82 | CONGONHINHAS | 582 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 83 | CHOPINZINHO | 592 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 84 | WENCESLAU BRAZ | 599 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | PROJETO ARQUITETÔNI CO PADRÃO II | TERRE NO DOAD O |
| 85 | CASCAVEL | 609 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | TERRE NO DOAD O |
| 86 | PÉROLA | 611 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 87 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 617 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 88 | SALTO DO LONTRA | 618 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | NÃO |
| 89 | CASTRO | 622 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 90 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 652 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 91 | ARAPOTI | 668 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 92 | PINHAIS | 668 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 93 | ANDIRÁ | 700 | TJPR | CFTV | NADA CONSTA | NÃO |
| 94 | PARANACITY | 712 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO FINALIZADO | NÃO |
| 95 | ASTORGA | 713 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |


| 96 | CAMPO LARGO | 713 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE AMPLIAÇÃO | NÃO |
|-----|--------------------------------|-----|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| 97 | JACAREZINHO | 719 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 98 | REALEZA | 722 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO FINALIZADO | NÃO |
| 99 | FAZENDA RIO GRANDE | 725 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO ARQUITETÔNI CO DEA REFORMA E AMPLIAÇÃO | NÃO |
| 100 | IBIPORÃ | 728 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 101 | ASSAÍ | 732 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 102 | PALMEIRA | 743 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | NÃO |
| 103 | CATANDUVAS | 744 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 104 | TIBAGI | 745 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 105 | MATINHOS | 747 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 106 | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | 756 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 107 | FORMOSA DO OESTE | 763 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 108 | CANTAGALO | 781 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 109 | IMBITUVA | 802 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 110 | REBOUÇAS | 833 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 111 | ICARAÍMA | 836 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |

| 112 | TOMAZINA 837 | | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
|-----|-------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 113 | DOIS VIZINHOS | 841 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 114 | RIBEIRÃO CLARO | 852 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 115 | ORTIGUEIRA | 860 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 116 | ALTÔNIA | 862 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 117 | SERTANÓPOLIS | 873 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 118 | PALMAS | 893 | ESTADO DO PARANÁ | RECEBIDA INAUGURAD A | NADA CONSTA | NÃO |
| 119 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 933 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 120 | CRUZEIRO DO OESTE | 945 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | NÃO |
| 121 | CAMPINA GRANDE DO SUL | 950 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 122 | IVAIPORÃ | 950 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 123 | TOLEDO | 954 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 124 | CERRO AZUL | 957 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 125 | LAPA | 998 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | TERRE NO DOAD O |
| 126 | FOZ DO IGUAÇÚ | 1.064 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 127 | MATELÂNDIA 1.085 | | TJPR | INAUGURAD A RECEBIMENT O PROVISÓRIO | NADA CONSTA | NÃO |
| 128 | CAMBÉ | 1.110 | ESTADO DO PARANÁ | INAUGURAD A SEM RECEBIMENT | NADA CONSTA | NÃO |

| | | | | O PROVISÓRIO | | |
|-----|------------------------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 129 | PORECATÚ | 1.113 | TJPR | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 130 | GOIOERÊ | 1.116 | TJPR | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 131 | PALOTINA | 1.172 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 132 | SANTA HELENA | 1.256 | TJPR | REFORMA | EXECUTIVO NOVO FÓRUM FINALIZADO | TERRE NO DOAD O |
| 133 | GUARATUBA | 1.325 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 134 | SIQUEIRA CAMPOS | 1.345 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 135 | CAMPINA DA LAGOA | 1.392 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 136 | IBAITI | 1.449 | TJPR | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 137 | ENGENHEIRO BELTRÃO | 1.477 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 138 | PATO BRANCO | 1.487 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | NÃO |
| 139 | XAMBRÊ | 1.513 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 140 | GUARAPUAVA | 1.551 | TJPR | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 141 | SÃO JOÃO DO IVAÍ | 1.568 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | NÃO |
| 142 | RIO NEGRO | 1.640 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 143 | SANTA FÉ | 1.644 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 144 | CORONEL VIVIDA | 1.660 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 145 | PALMITAL | 1.688 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 146 | IPIRANGA | 1.722 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 147 | LARANJEIRAS DO SUL | 1.725 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 148 | TERRA BOA | 1.735 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 149 | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 1.738 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | NÃO |

| 150 | TERRA ROXA | 1.740 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----|
| 151 | PARAÍSO DO NORTE | 1.744 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 152 | BARRACÃO | 1.752 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 153 | CIDADE GAÚCHA | 1.958 | TJPR | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 154 | MALLET | 2.025 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 155 | CAMBARÁ | 2.047 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | NADA CONSTA | NÃO |
| 156 | MARMELEIRO | 2.086 | TJPR | RECEBIDA INAUGURAD A | NADA CONSTA | NÃO |
| 157 | GUARANIAÇÚ | 2.121 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 158 | SÃO JOÃO | 2.248 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 159 | NOVA FÁTIMA | 2.620 | TJPR | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 160 | 60 BELA VISTA DO PARAÍSO 2.648 | | TJPR | INAUGURAD A RECEBIMENT O PROVISÓRIO | NADA CONSTA | NÃO |

4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

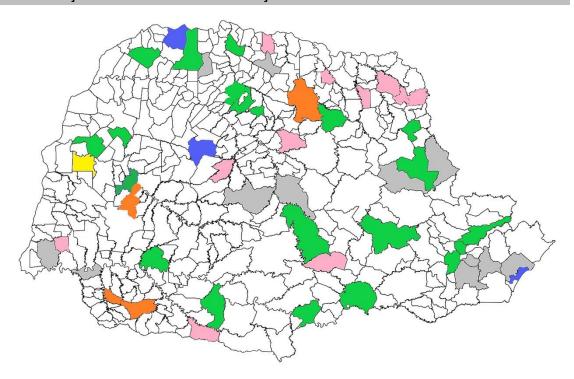

Obras em andamento

<u>Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal</u>

Ampére – Construção Novo Fórum

Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum

Corbélia – Construção Novo Fórum

Obras em recebimento

Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum

Curitiba – Sonorização plenário Anexo

Obras em licitação ou preparação de edital

Nova Aurora – Novo Fórum

Terra Rica – Novo Fórum

Pontal do Paraná – Novo Fórum

Projetos complementares contratados

Maringá – Projetos e Assessoramento – em recebimento

Curitiba - Centro Judiciário - Projetos e Assessoramento CJC

<u>Colombo – Projetos e Assessoramento Novo Fórum</u>

Ponta Grossa – Proietos e Assessoramento Novo Fórum

Paranavaí e União da Vitória – Projetos Novo Fórum

Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos - suspenso

Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos - suspenso

Jaguariaíva, Bocaiúva do Sul, Peabiru, Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, Wenceslau Braz – Projetos Novo Fórum

Jandaia do Sul, Quedas do Iguaçú, Colorado, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Loanda, Marialva – Projetos Novo Fórum

Campo Mourão – Usina Fotovoltaica – Projetos

Projetos complementares em contratação/preparação

Santo Antônio da Platina e Irati – Projetos Novo Fórum

Curitiba Sede Mauá – Usina Fotovoltaica

Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, Iretama, Carlópolis

Medianeira – Projetos Novo Fórum

Proietos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade

| Terrenos em análise ou legalização de doação |
|----------------------------------------------|
| Alto Paraná |
| Morretes |
| Piraí do Sul |
| Cândido de Abreu |
| Paranaguá |
| São José dos Pinhais |
| Capanema |
| Sengés |
| São Miguel do Iguaçú |
| Pitanga |
| Medianeira |
| Piraquara |
| Jaguapitã |

5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 15 AÇÕES

No período do relatório mantém-se em Recebimento Provisório as obras de:

- Pleno do Palácio da Justiça
- Santa Helena
- Loanda

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas ações, obras e serviços de acessibilidade indicadas em amarelo.

PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE

COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE COR INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO AMARELA COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO **PROVISÓRIO** COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO **DEFINITIVO** COR ROXA INDICA OBRA QUE INCLUI EXECUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL

| | COMARCA | STATUS | OES | Observações |
|---|------------------------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Almirante Tamandaré | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 29/03/2022 Com DAR para esclarecimento quanto ao projeto 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 2 | Capanema | SOB ANÁLISE DA DM | | 16/07/2021, enviado para análise da DM 21/06/2021, Com DE para levantamento e contratação |


| 3 | Curitiba - Descentraliza do Sta Felicidade | | 06/11/2 019 | 08/04/2022 Formalizado novo aditivo de preço e prazo com mais 45 dias para finalização 18/02/2022 Formalizado novo aditivo de prazo com mais 45 dias para finalização 10/12/2021 Formalizado aditivo de preço e de prazo. Nova data finalização 02/2022 04/11/2021 Em análise novo aditivo de preço 20/10/2020 Autorizado Aditivo de preço e prazo. Nova data finalização 08/2021. 18/10/2020 Segundo Aditivo formalizado 5917626 prazo e acréscimo de serviços. Prazo final 14/03/2021 06/10/2020 Acessibilidade em atendimento por obra em andamento 12/06/2020 Com a DAR para Analise de Viabilidade |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Curitiba - Tribunal do Juri | CONTRATADO - EM EXECUÇÃO | 29/10/2 020 | 15/03/2022 Formalizado aditivo de preço e prazo (30 dias) 14/02/2022 Em análise aditivo de preço e prazo (30 dias) 29/10/2021 Formalizado 2ª Termo Aditivo prazo mais 45 dias e preço a mais 28/07/2021 Formalizado 1º Termo Aditivo prazo mais 60 dias 29/10/2020 OS emtitida 5741916 14/09/2020 Obra autorizada pelo depacho 5527845 aguarda OS 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 5 | Tribunal | COM RECEBIMENTO DEFINITIVO 7762124 | 22/07/2 020 | 13/06/2022 Recebimento Definitivo 7762124 09/04/2021 Recebimento provisório 6341494 26/02/2021 Autorizado 3º aditivo de prazo em mais 30 dias 25/11/2020 Autorizado 2º aditivo de serviços 10/09/2020 Prazo aditado em 30 dias 09/07/2020 OS emitida 12/06/2020 Contrato assinado 5212242 prazo 2 meses |
| 6 | Faxinal | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado - com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto |

| 7 | Imbituva | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 12/06/06 Com DE para levantamento e contratação |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Loanda | COM RECEBIMENTO DEFINITIVO 7666682 | 06/07/2 021 | 11/05/2022 Recebimento definitivo 7666682 23/03/2022 Recebimento provisório 7479169 10/02/2022 Formalizado termo aditivo de preço e prazo, concedido mais 60 dias para finalização 09/12/2021 Em análise aditivo de preço e prazo 06/07/2021 OS emitida 29/03/2021 Procedimento enviado a DE para contratação via procedimento licitatório 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 9 | Mangueirinh a | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 10 | Morretes | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto |
| 11 | Quedas do Iguaçú | EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA | | 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 12 | Ribeirão Claro | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 24/03/2021 Com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto |
| 13 | Santa Helena | COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209 | 01/07/2 020 | 26/01/2021 Recebimento Provisorio 6016209 09/07/2020 Reforma contratada OS emitida 180 dias 12/06/2020 Aguarda documentação da construtora |
| 14 | União da Vitória - Fórum Central | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019 |
| 15 | São Jerônimo da Serra | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação 03/12/2020 Finalizado projeto de arquitetura |


6. **DESEMBOLSOS TOTAIS**


No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R\$ 4.197.381,43 correspondentes a 12,63 % do valor inicialmente planejado de R\$ 33.237.617,58 para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

| | Desembolso no mês do relatório | Desembolso acumulado no ano |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Obras em execução ou em | R\$ 2.076.531,24 | R\$ 9.486.965,05 |
| Recebimento | | |
| Proj. complementares | R\$ 126.029,83 | R\$ 167.934,44 |
| Manutenção e Atas | R\$ 1.994.820,36 | R\$ 11.584.584,54 |
| ACUMULADO ANUAL | R\$ 4.197.381,43 | R\$ 21.239.484,03 |

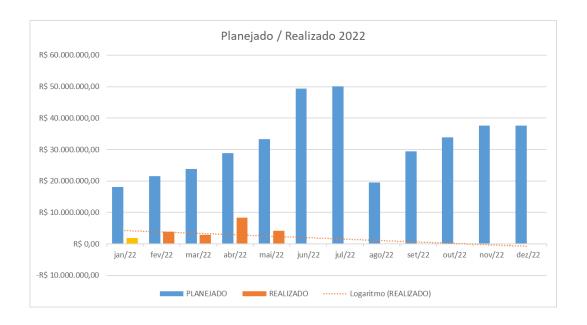

6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório)

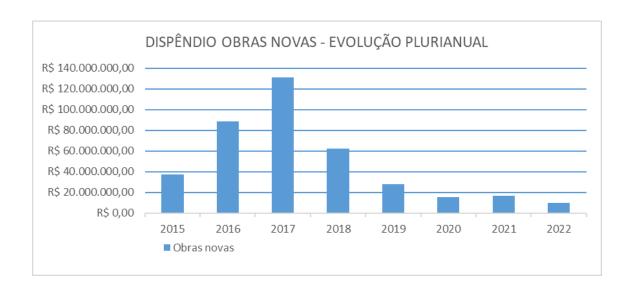

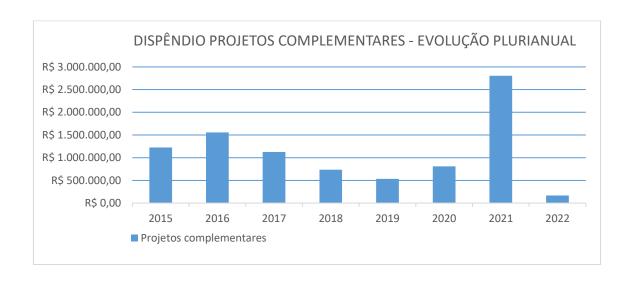




7. CONTRATOS DE MANUTEÇÃO E ATAS

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

- 7.1 Manutenção Elevadores
- 7.2 Manutenção Ar condicionado
- 7.3 Manutenção Geradores
- 7.4 Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)
- 7.5 Manutenção Sala Segura e Data Center
- 7.6 Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia
- 7.7 Ata de Instalação de Ar condicionado
- 7.8 Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor no valor de R\$ 1.994.820,36 e acumulado anual de R\$ 11.584.584,54, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

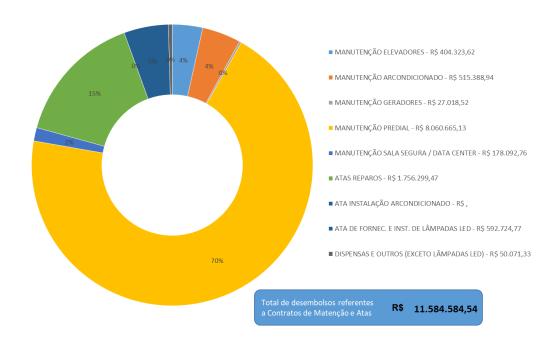

DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS:

As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face à próximo esgotamento da vigência do contrato: verde (não necessita atenção), amarelo (final da vigência próximo) e vermelho (contrato vencido).


7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

| Regional | Contratado | | Vigência | Valor contrato |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| Regional Leste | THYSSENKRUPP | ELEVADORES | 13/10/2022 | R\$ 481.501,56 |
| | S/A | | | |
| Regional Oeste | THYSSENKRUPP | ELEVADORES | 13/10/2022 | R\$ 117.597,36 |
| | S/A | | | |
| Regional Norte | THYSSENKRUPP | ELEVADORES | 04/11/2022 | R\$ 154.415,75. |
| | S/A | | | |

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I

| Desembolso no período do Relatório | R\$ 57.226,79 |
|------------------------------------------|----------------|
| Desembolso acumulado no ano do Relatório | R\$ 404.323,62 |



Destino Total atendimentos Finalizados Abertos

Regional Leste Dados não informados Regional Leste Dados não informados Regional Norte Dados não informados

7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

| Destino | Contratado | Vigência | Valor contrato |
|--------------|---------------------------|------------|------------------|
| Paraná total | GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO | 08/02/2023 | R\$ 5.759.707,44 |
| | ITDA | | |

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório R\$ 118.532,61

Desembolso acumulado no ano do Relatório R\$ 515.388,94



Destino Total de chamados Finalizados Abertos Paraná total Chamados finalizados totais no mês (incluem chamados abertos em outros meses e finalizados no mês do relatório)

Dados não informados

7.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, com fornecimento integral de peças.

Destino Contratado Vigência Valor contrato
Paraná total EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS E GERADORES - ME

Vigência Valor contrato
R\$ 294.166,48

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório R\$ 3.491,82

Desembolso acumulado no ano do Relatório R\$ 27.018,52



Destino Total atendimentos Finalizados Abertos
Paraná total Dados não informados

7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços.


Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Para relação das unidades por Regionais, ver Anexos.

DestinoContratadoVigênciaValor contratoParanáEQS ENGENHARIA S.A.01/04/2022R\$ 12.097.078,36

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório R\$ 1.802.956,93



TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência abril/2022 fornecidos por DEA-DM)

Relação das unidades do contrato (exceto Regional 1)

| | | VALOR |
|-------------------|----------|----------------|
| UNIDADES | SITUAÇÃO | ATESTADO |
| CAMPO MOURÃO | Atestado | R\$ 9.681,28 |
| CASCAVEL | Atestado | R\$ 16.585,23 |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | Atestado | R\$ 6.278,52 |
| CRUZEIRO DO OESTE | Atestado | R\$ 12.283,41 |
| FOZ DO IGUAÇU | Atestado | R\$ 3.960,47 |
| GUARAPUAVA | Atestado | R\$ 25.564,47 |
| LONDRINA | Atestado | R\$ 28.782,68 |
| MARINGÁ | Atestado | R\$ 9.593,86 |
| PATO BRANCO | Atestado | R\$ 10.158,38 |
| PONTA GROSSA | Atestado | R\$ 7.635,48 |
| RIBEIRÃO CLARO | Atestado | R\$ 2.844,81 |
| TELÊMADO BORBA | Atestado | R\$ 2.825,43 |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Atestado | R\$ 5.026,58 |
| 13 UNIDADES | TOTAL: | R\$ 141.220,59 |

Relação das Cidades (exceto Regional 1)

| | | VALOR |
|---------------------|----------|--------------|
| UNIDADES | SITUAÇÃO | ATESTADO |
| Alto Paraná | Atestado | R\$ 36,07 |
| Alto Piquiri | Atestado | R\$ 436,50 |
| Altônia | Atestado | R\$ 239,24 |
| Ampére | Atestado | R\$ 22,86 |
| Apucarana | Atestado | R\$ 7.283,17 |
| Arapoti | Atestado | R\$ 386,81 |
| Assis Chateaubriand | Atestado | R\$ 1.237,87 |
| Astorga | Atestado | R\$ 175,08 |
| Barbosa Ferraz | Atestado | R\$ 495,74 |

| Bela Vista do Paraíso | Atestado | R\$ 121,46 |
|----------------------------------|----------|----------------------------|
| Cambará | Atestado | R\$ 598,31 |
| Cambé | Atestado | R\$ 3.645,18 |
| Campo Mourão | Atestado | R\$ 834,86 |
| Cândido de Abreu | Atestado | R\$ 123,33 |
| Cantagalo | Atestado | R\$ 26,28 |
| Capanema | Atestado | R\$ 6.605,97 |
| Carlópolis | Atestado | R\$ 681,21 |
| Cascavel | Atestado | R\$ 5.485,01 |
| Castro | Atestado | R\$ 2.557,32 |
| Catanduvas | Atestado | R\$ 53,47 |
| Centenário do Sul | Atestado | R\$ 354,74 |
| Chopinzinho | Atestado | R\$ 3.037,52 |
| Cianorte | Atestado | R\$ 1.333,43 |
| Clevelândia | Atestado | R\$ 467,29 |
| Colorado | + | |
| | Atestado | R\$ 380,18 R\$ 3.855,72 |
| Cornélio Procópio Coronel Vivida | Atestado | |
| | Atestado | R\$ 494,64 |
| Cruzeiro do Oeste | Atestado | R\$ 4.015,79 |
| Curiúva | Atestado | R\$ 67,86 |
| Dois Vizinhos | Atestado | R\$ 587,23 |
| Engenheiro Beltrão | Atestado | R\$ 6.098,48 |
| Faxinal | Atestado | R\$ 701,38 |
| Formosa do Oeste | Atestado | R\$ 778,31 |
| Foz do Iguaçu | Atestado | R\$ 3.073,62 |
| Francisco Beltrão | Atestado | R\$ 554,23 |
| Guarapuava | Atestado | R\$ 17.267,28 |
| Ibaiti | Atestado | R\$ 118,12 |
| Ibiporã | Atestado | R\$ 830,69 |
| Icaraíma | Atestado | R\$ 283,40 |
| Imbituva | Atestado | R\$ 330,83 |
| ipiranga | Atestado | R\$ 354,57 |
| Irati | Atestado | R\$ 1.378,40 |
| Ivaiporã | Atestado | R\$ 918,77 |
| Jacarezinho | Atestado | R\$ 1.566,14 |
| Jaguariaíva | Atestado | R\$ 473,51 |
| Jandaia do Sul | Atestado | R\$ 567,67 |
| Laranjeiras do Sul | Atestado | R\$ 771,98 |
| Londrina | Atestado | R\$ 14.033,32 |
| Marechal Cândido Rondon | Atestado | R\$ 110,39 |
| Marialva | Atestado | R\$ 27,87 |
| Maringá | Atestado | R\$ 4.439,03 |
| Marmeleiro | Atestado | R\$ 531,08 |
| Matelândia | Atestado | R\$ 2.125,38 |
| Medianeira | Atestado | R\$ 248,15 |
| Nova Esperança | Atestado | R\$ 327,70 |
| Nova Fátima | Atestado | R\$ 450,65 |
| Palmeira | Atestado | R\$ 651,78 |
| Palmital | Atestado | R\$ 662,54 |
| Palotina | Atestado | R\$ 1.733,01 |
| Paraíso do Norte | Atestado | R\$ 2.337,48 |

| Paranacity | Atestado | R\$ 115,90 |
|---------------------------|----------|----------------|
| Paranavaí | Atestado | R\$ 1.544,29 |
| Pato Branco | Atestado | R\$ 2.579,25 |
| Pinhão | Atestado | R\$ 2.970,20 |
| Piraí do Sul | Atestado | R\$ 267,92 |
| Pitanga | Atestado | R\$ 531,66 |
| Ponta Grossa | Atestado | R\$ 2.999,55 |
| Porecatu | Atestado | R\$ 846,91 |
| Primeiro de Maio | Atestado | R\$ 83,48 |
| Prudentópolis | Atestado | R\$ 1.870,21 |
| Quedas do Iguaçu | Atestado | R\$ 566,83 |
| Realeza | Atestado | R\$ 91,42 |
| Rebouças | Atestado | R\$ 85,92 |
| Reserva | Atestado | R\$ 34,93 |
| Ribeirão do Pinhal | Atestado | R\$ 661,51 |
| Rolândia | Atestado | R\$ 1.237,09 |
| Santa Helena | Atestado | R\$ 298,19 |
| Santa Mariana | Atestado | R\$ 712,33 |
| Santo Antônio do Sudoeste | Atestado | R\$ 1.218,01 |
| São João | Atestado | R\$ 574,85 |
| São Miguel do Iguaçu | Atestado | R\$ 638,70 |
| Sarandi | Atestado | R\$ 1.625,33 |
| Siqueira Campos | Atestado | R\$ 143,36 |
| Telêmaco Borba | Atestado | R\$ 2.050,68 |
| Tibagi | Atestado | R\$ 43,70 |
| Toledo | Atestado | R\$ 1.339,99 |
| Tomazina | Atestado | R\$ 332,56 |
| Umuarama | Atestado | R\$ 1.221,81 |
| União da Vitória | Atestado | R\$ 5.026,58 |
| Wenceslau Braz | Atestado | R\$ 121,54 |
| 90 CIDADES | TOTAL: | R\$ 141.220,59 |

Para maiores informações, ver Relatórios Divisionais da Divisão de Manutenção

Relatório Regional 1

Período considerado - Contrato EQS Engenharia – fevereiro/2022

| CIDADE | VALOR APROVADO |
|-----------------------|----------------|
| Almirante Tamandaré | R\$ 2.606,69 |
| Antonina | - |
| Araucária | R\$ 120,47 |
| Bocaiúva Do Sul | R\$ 150,34 |
| Campina Grande Do Sul | R\$ 102,41 |
| Campo Largo | R\$ 1.333,48 |
| Cerro Azul | - |
| Colombo | R\$ 103,37 |
| Curitiba | R\$ 67.022,87 |
| Fazenda Rio Grande | R\$ 2.519,31 |
| Guaratuba | - |

| Lapa | R\$ 891,26 |
|--------------------------|----------------|
| Matinhos | |
| Morretes | |
| Paranaguá | R\$ 7.084,57 |
| Pinhais | R\$ 2.592,73 |
| Piraquara | R\$ 892,80 |
| Pontal Do Paraná | R\$ 2.517,48 |
| Rio Branco do Sul | R\$ 632,88 |
| Rio Negro | R\$ 1.378,04 |
| São José dos Pinhais | R\$ 8.712,35 |
| TOTAL MEDIÇÃO | R\$ 98.661,05 |
| TOTAL ACUMULADO CONTRATO | R\$ 550.398,00 |
| TOTAL ACUMULADO 2022* | R\$ 214.800,97 |

137 Ordens de Serviço do tipo Corretivas foram atendidas no período 82 Ordens de Serviço do tipo Preventivas foram atendidas no período.

PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – Maio/2022 (exceto Regional 1) DADOS NÃO FORNECIDOS.

7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER

Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.


| Destino | Contratado | | Vigência | Valor contrato |
|-------------|------------------------|---|------------|----------------|
| Sede Álvaro | VIRTUAL INFRAESTRUTURA | Ε | 22/07/2022 | R\$ 444.998,13 |
| Ramos | ENERGIA LTDA | | | |

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

| Destino | Contratado | Vigência | Valor contrato |
|-------------|------------------------|--------------|----------------|
| Sede Prédio | VIRTUAL INFRAESTRUTURA | E 01/04/2022 | R\$ 547.800,00 |
| Anexo | ENERGIA LTDA | | |

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2) R\$ 0,00

Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2) R\$ 178.092,76



7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.

| Destino | Contratado | Vigência | Valor máximo |
|----------------------|------------------------------|------------|------------------|
| Regional Guarapuava | TAS EMPREENDIMENTOS | 03/11/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| | IMOBILIÁRIOS LTDA | | |
| Regional RMC e | JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP | 03/11/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Litoral | | | |
| Regional Cascavel | TAS EMPREENDIMENTOS | 21/09/2021 | R\$ 1.000.000,00 |
| | IMOBILIÁRIOS LTDA | | |
| Regional Francisco | CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA | 12/11/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Beltrão | | | |
| Regional Londrina | CONSTRUTORA DOTTO LTDA | 01/12/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Regional Jacarezinho | TAS EMPREENDIMENTOS | 04/08/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| | IMOBILIÁRIOS LTDA | | |
| Regional Umuarama | CONSTRUTORA DOTTO LTDA | 29/09/2022 | R\$ 1.500.000,00 |
| Regional Ponta | JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP | 04/08/2022 | R\$ 2.000.000,00 |
| Grossa | | | |
| Regional Maringá | COVIARTES MATERIAIS DE | 03/05/2023 | R\$ 1.000.000,00 |
| | CONSTRUÇÃO LTDA | | |
| Regional Curitiba | TAS EMPREENDIMENTOS | 25/03/2023 | R\$ 1.500.000,00 |
| | IMOBILIÁRIOS LTDA | | |

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

| Desembolso no período do Relatório | R\$ 12.612,21 |
|------------------------------------------|------------------|
| Desembolso acumulado no ano do Relatório | R\$ 1.756.299,47 |



7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

Destino Contratado Vigência Valor máximo
Paraná total ARBOM COMÉRCIO DE 15/06/2023 R\$ 1.200.000,00
REFRIGERAÇÃO EIRELI

Desembolso no período do Relatório R\$ 0,00 Desembolso acumulado no ano do Relatório R\$ 0,00



Destino Total atendimentos Finalizados Abertos
Paraná total Dados não informados


Destino/objeto Contratado Vigência Valor contratado ESTADO – CONSTRUTORA MORAIS 26/02/2025 R\$ 3.511.099,85 instalação E LAGE LTDA EPP

lâmpadas LED

Desembolso no período do Relatório R\$ 0,00

Desembolso acumulado no ano do Relatório R\$ 592.724,77

Desembolso acumulado total do contrato até o momento R\$ 1.603.037,83

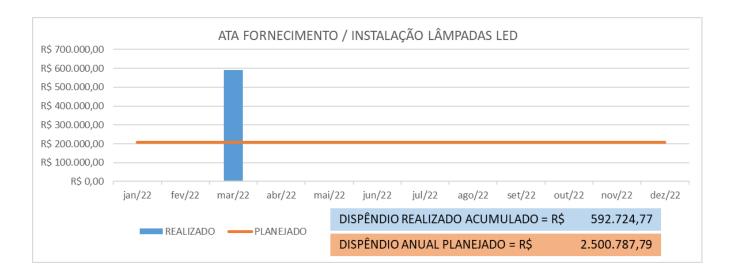

Demais contratações em regime de dispensa:

Desembolso no período do Relatório R\$ 0,00

Desembolso acumulado no ano do Relatório R\$ 50.071,33



8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS

REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Almirante Tamandaré

Campina grande do sul

Campo largo

Curitiba - Álvaro ramos

Curitiba - anexo

Curitiba - ahú

Curitiba - boqueirão

Curitiba - cic

Curitiba - fazenda pública

Curitiba - f. Cível

Curitiba - f. Cível ii

Curitiba - mateus leme

Curitiba - mauá

Curitiba - je pinheirinho

Curitiba – rua da glória, 290

Curitiba – rua da glória, 362

Curitiba – rua da glória, 393

Curitiba - santa felicidade

Curitiba - vep

Curitiba – técnico residente

Guarapuava

Guaratuba

Lapa

Paranaguá

Paranaguá – jecc

Piraquara

Ponta grossa

Rio negro

São josé dos pinhais, v. Infância e juventude

São josé dos pinhais, v. Fazenda pública

Teixeira soares

União da vitória

União da vitória – v de família

REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Assis chateaubriand

Capanema

Cascavel

Chopinzinho

Coronel vivida

Dois vizinhos

Foz do iguaçú

Francisco beltrão

Laranjeiras do sul

Marechal cândido rondon

Medianeira

Pato branco Quedas do iguaçú Santo antônio do sudoeste São miguel do iguaçú Toledo

REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS

Apucarana

Bela vista do paraíso

Cambé

Campo mourão

Cianorte

Congoinhas

Cornélio procópio

Cruzeiro do oeste

Engenheiro beltrão

Ibaiti

Ibiporã

Ivaiporã

Londrina – fórum cível

Londrina - vep

Marialva

Maringá – fórum principal

Maringá – juizado especial

Maringa – fórum novo

Porecatu

Santa fé

Santo antônio da platina

Telêmaco borba

Terra boa

Tibagi

8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS

PARANÁ TOTAL

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS** Total: 3947 LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado

| Split Hi Wall 7.500Btu/h | 17 |
|-----------------------------|-----|
| Split Hi Wall 9.000Btu/h | 198 |
| Split Hi Wall 12.000Btu/h | 322 |
| Split Hi Wall 18.000Btu/h | 788 |
| Split Hi Wall 22.000Btu/h | 52 |
| Split Hi Wall 24.000Btu/h | 521 |
| Split Hi Wall 30.000Btu/h | 346 |
| Split Piso-Teto 12.000Btu/h | 21 |
| Split Piso-Teto 18.000Btu/h | 24 |
| Split Piso-Teto 24.000Btu/h | 58 |
| Split Piso-Teto 30.000Btu/h | 36 |

| Split Piso-Teto 36.000Btu/h | 201 |
|--------------------------------|-----|
| Split Piso-Teto 42.000Btu/h | 5 |
| Split Piso-Teto 48.000Btu/h | 123 |
| Split Piso-Teto 60.000Btu/h | 148 |
| Split Cassete 18.000Btu/h | 110 |
| Split Cassete 24.000Btu/h | 61 |
| Split Cassete 30.000Btu/h | 55 |
| Split Cassete 36.000Btu/h | 63 |
| Split Cassete 48.000Btu/h | 95 |
| Split Cassete 60.000Btu/h | 15 |
| Split Built-in 30.000Btu/h | 1 |
| Split Built-in 48.000Btu/h | 3 |
| Split Built-in 60.000Btu/h | 2 |
| Janeleiro 2.500Btu/h | 2 |
| Janeleiro 7.500Btu/h | 5 |
| Janeleiro 10.000Btu/h | 10 |
| Janeleiro 12.000Btu/h | 134 |
| Janeleiro 15.000Btu/h | 4 |
| Janeleiro 18.000Btu/h | 126 |
| Janeleiro 19.000Btu/h | 135 |
| Janeleiro 20.000Btu/h | 1 |
| Janeleiro 21.000Btu/h | 191 |
| Janeleiro 30.000Btu/h | 74 |
| Cortina de Ar | 36 |
| Caixas de Ventilação Mecânicas | 15 |
| | |

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO CENTRAL**: Total de 28 sistemas LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba - álvaro ramos

Curitiba – anexo

Curitiba – centro judiciário

Curitiba – champagnat

Curitiba – mauá

Curitiba – palácio da justiça

Curitiba – pinheirinho

Curitiba – restaurante

Curitiba – tribunal do júri

Campo largo

Guaratuba

Guarapuava

Rio negro

Lapa

Laranjeiras do sul

Cascavel

Coronel vivida

Formosa do oeste

Foz do iguaçu

Pato branco

Toledo

Cambé

Engenheiro beltrão

Jacarezinho

Paraíso do norte Santa fé Terra boa Marechal cândido rondon

8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS

PARANÁ TOTAL

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba:

Prédio Álvaro Ramos.

Palácio da Justiça.

Palácio da Justiça Anexo.

Sede Mauá.

Fórum da Família, da Criança e do Adolescente.

Fórum Cível II.

Outras Comarcas:

Foz do Iguaçu.

Londrina.

Guarapuava.

8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS

REGIONAL GUARAPUAVA

Cândido de abreu

Cantagalo

Guarapuava

Irati

Iretama

Ivaiporã

Laranjeiras do sul

Mallet

Manoel ribas

Palmital

Pinhão

Pitanga

Prudentópolis

União da vitória

REGIONAL RMC E LITORAL

Araucária,

Almirante Tamandaré,

Antonina,

Bocaiúva do Sul,

Campina Grande do Sul,

Campo Largo,

Cerro Azul,

Colombo,

Fazenda Rio Grande,

Guaratuba,

Matinhos,

Morretes,

Paranaguá,

Pinhais,

Piraquara,

Pontal do Paraná,

Rio Branco do Sul,

São José dos Pinhais.

REGIONAL DE CASCAVEL

Assis chateaubriand

Campina da lagoa

Capanema

Capitão leônidas marques

Cascavel

Catanduvas

Corbélia

Formosa do oeste

Foz do iguaçu

Guaraniaçu

Mamborê

Marechal cândido rondon

Matelândia

Medianeira

Nova aurora

Palotina

Quedas do iguaçu

Santa helena

São miguel do iguaçu

Toledo

Ubiratã

REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Ampére

Barração

Chopinzinho

Clevelandia

Coronel vivida

Dois vizinhos

Francisco beltrão

Mangueirinha

Marmeleiro

Palmas

Pato branco

Realeza

Salto do lontra

Santo antônio do sudoeste

São joão

REGIONAL DE LONDRINA

Apucarana,

Arapongas

Assaí

Bela Vista do Paraíso

Cambé

Congonhinhas

Faxinal

Grandes Rios

Ibiporã

Londrina

Marilândia do Sul

Ortigueira

Primeiro de Maio

Rolândia

São Jerônimo da Serra

Sertanópolis

Uraí.

8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS

Relação das unidades do contrato e respectivas Regionais (Sedes)

| Unidade | Sede | Regional |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Curitiba | Augusto Severo | I |
| Curitiba | Palácio da Justiça | I |
| Curitiba | Mauá | ı |
| Curitiba | Centro Judiciário Ahú | I |
| Curitiba | Barracão | ı |
| Ponta Grossa (Ponta Grossa) | Fórum da Comarca de Ponta Grossa | II |
| Ponta Grossa (União da Vitória) | Fórum da Família e da Infância e Juventude | II |
| Guarapuava (Guarapuava) | Comarca de Guarapuava | III |
| Guarapuava (Guarapuava) | Comarca de Guarapuava | III |
| Francisco Beltrão (Pato Branco) | Comarca de Pato Branco | IV |
| Francisco Beltrão (Pato Branco) | Comarca de Pato Branco | IV |
| Londrina (Londrina) | Fórum Cível da Comarca de Londrina | IX |
| Londrina (Londrina) | Fórum Cível da Comarca de Londrina | IX |
| Londrina (Londrina) | Fórum Cível da Comarca de Londrina | IX |
| Cascavel (Foz do Iguaçu) | Comarca de Foz do Iguaçú | V |
| Cascavel (Cascavel) | Comarca de Cascavel | V |
| Cascavel (Cascavel) | Comarca de Cascavel | V |
| Campo Mourão (Campo Mourão) | Comarca de Campo Mourão | VI |
| Umuarama (Cruzeiro do Oeste) | Comarca de Cruzeiro do Oeste | VII |
| Umuarama (Cruzeiro do Oeste) | Comarca de Cruzeiro do Oeste | VII |
| Maringá (Maringá) | Comarca de Maringá | VIII |
| Maringá (Maringá) | Comarca de Maringá | VIII |
| Maringá (Maringá) | Comarca de Maringá | VIII |

| Santo | Antônio | da | Platina | Comarca de Ribeirão Claro | X |
|---------|---------|----|---------|------------------------------|----|
| Santo | Antônio | da | Platina | Comarca de Cornélio Procópio | Χ |
| Telêmac | 0 | | Borba | Comarca de Telêmaco Borba | ΧI |

Comarcas atendidas por Regional (Sede)

| REGIONAL CURITIBA | UNIDADE | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| ALMIRANTE TAMANDARÉ | Fórum local | | |
| ANTONINA | Fórum local | | |
| ARAUCÁRIA | Fórum local | | |
| BOCAIÚVA DO SUL | Fórum local | | |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | Fórum local | | |
| CAMPO LARGO | Fórum local | | |
| CERRO AZUL | Fórum local | | |
| COLOMBO | Fórum Central | | |
| COLOMBO | Juizados Especiais | | |
| COLOMBO | Arquivos gerais | | |
| COLOMBO | Fórum Cível | | |
| COLOMBO | Fórum da Família | | |
| COLOMBO | Arquivos | | |
| CURITIBA | Sede Álvaro Ramos | | |
| CURITIBA | Sede casa Álvaro Ramos 1 | | |
| CURITIBA | Sede casa Álvaro Ramos 2 | | |
| CURITIBA | Barracão Anita Garibaldi | | |
| CURITIBA | Sede Arquivo Pinhais | | |
| CURITIBA | Sede Arquivo São José dos | | |
| CURITIBA | Barracão Flávio Dallegrave | | |
| CURITIBA | Sede Lysimaco Ferreira da | | |
| CURITIBA | Centro de Educação Infantil | | |
| CURITIBA | Cetrans | | |
| CURITIBA | Cetrans - DETO | | |
| CURITIBA | Centro Judiciário de Curitiba | | |
| CURITIBA | Sede Cândido de Abreu | | |
| CURITIBA | Sede Pery Moreira | | |
| CURITIBA | Sede Rua da Glória 1 | | |
| CURITIBA | Sede Rua da Glória 2 | | |
| CURITIBA | Sede Rua da Glória 3 | | |
| CURITIBA | Sede Nilo Peçanha | | |
| CURITIBA | Sede Ivo Leão | | |
| CURITIBA | Escola da Magistratura | | |
| CURITIBA | Fórum Cível 1 (Cândido de | | |
| CURITIBA | Fórum Cível 2 (Mateus Leme) | | |
| CURITIBA | Sede Mauá | | |
| CURITIBA | Sede Mauá 2 (Augusto Severo) | | |
| CURITIBA | Fórum Descentralizado do | | |
| CURITIBA | Fórum Descentralizado de | | |
| CURITIBA | Fórum Descentralizado do CIC | | |

| CLIDITID A | er |
|----------------------|--------------------------------|
| CURITIBA | Fórum Descentralizado do |
| CURITIBA | Fórum Descentralizado do Sítio |
| CURITIBA | Sede Mateus Leme |
| CURITIBA | Complexo do Palácio da Justiça |
| CURITIBA | Tribunal do Júri |
| CURITIBA | Sede Avenida Iguaçu |
| CURITIBA | Vara de Adolescentes |
| CURITIBA | Vara de Execuções Penais (João |
| FAZENDA RIO GRANDE | Fórum local |
| FAZENDA RIO GRANDE | Juizados Especiais |
| GUARATUBA | Fórum local |
| LAPA | Fórum local |
| MATINHOS | Fórum local |
| MORRETES | Fórum local |
| PARANAGUÁ | Fórum Central |
| PARANAGUÁ | Fórum Cível |
| PARANAGUÁ | Juizados Especiais |
| PARANAGUÁ | Arquivos gerais |
| PINHAIS | Fórum local |
| PIRAQUARA | Fórum Central |
| PIRAQUARA | Fórum Cível e Família |
| PONTAL DO PARANÁ | Fórum local |
| RIO BRANCO DO SUL | Fórum local |
| RIO NEGRO | Fórum local |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Fórum Central |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Fórum da Família |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Juizados Especiais |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Fórum da Fazenda Pública |
| | |

| SEDE PONTA GROSSA | UNIDADE |
|-------------------|------------------------|
| CASTRO | Fórum local |
| IMBITUVA | Fórum local |
| IPIRANGA | Fórum local |
| JAGUARIAÍVA | Fórum local |
| PALMEIRA | Fórum local |
| PIRAÍ DO SUL | Fórum local |
| PONTA GROSSA | Fórum central |
| PONTA GROSSA | Sede Cejusc e arquivos |
| SENGÉS | Fórum local |

| SEDE UNIÃO DA VITÓRIA | UNIDADE |
|-----------------------|--------------------|
| IRATI | Fórum local |
| IRATI | Juizados Especiais |
| MALLET | Fórum local |
| REBOUÇAS | Fórum local |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFO | Fórum local |
| SÃO MATEUS DO SUL | Fórum local |

| TEIXEIRA SOARES | Fórum local |
|------------------|------------------|
| UNIÃO DA VITÓRIA | Fórum central |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Arquivos 1 |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Arquivos 2 |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Fórum da Família |

| SEDE TELÊMACO BORBA | UNIDADE |
|-----------------------|------------------|
| ARAPOTI | Fórum local |
| CÂNDIDO DE ABREU | Fórum local |
| CONGONHINHAS | Fórum local |
| CURIÚVA | Fórum local |
| IBAITI | Fórum local |
| ORTIGUEIRA | Fórum local |
| RESERVA | Fórum local |
| SÃO JERÔNIMO DA SERRA | Fórum local |
| TELÊMACO BORBA | Fórum central |
| TELÊMACO BORBA | Fórum da Família |
| TIBAGI | Fórum local |

| SEDE RIBEIRÃO CLARO | UNIDADE |
|--------------------------|-------------|
| CARLÓPOLIS | Fórum local |
| JACAREZINHO | Fórum local |
| JOAQUIM TÁVORA | Fórum local |
| RIBEIRÃO CLARO | Fórum local |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Fórum local |
| SIQUEIRA CAMPOS | Fórum local |
| TOMAZINA | Fórum local |
| WENCESLAU BRAZ | Fórum local |

| SEDE CORNÉLIO PROCÓPIO | UNIDADE |
|------------------------|--------------------|
| ANDIRÁ | Fórum local |
| BANDEIRANTES | Fórum local |
| CAMBARÁ | Fórum local |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | Fórum local |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | Juizados Especiais |
| NOVA FÁTIMA | Fórum local |
| RIBEIRÃO DO PINHAL | Fórum local |
| SANTA MARIANA | Fórum local |

| SEDE LONDRINA | UNIDADE |
|-----------------------|-------------|
| APUCARANA | Fórum local |
| ARAPONGAS | Fórum local |
| ASSAÍ | Fórum local |
| BELA VISTA DO PARAÍSO | Fórum local |
| CAMBÉ | Fórum local |
| FAXINAL | Fórum local |
| GRANDES RIOS | Fórum local |

| GRANDES RIOS | Arquivos gerais |
|-------------------|-------------------|
| IBIPORÃ | Fórum local |
| JAGUAPITÃ | Fórum local |
| LONDRINA | Fórum local |
| LONDRINA | Fórum Criminal |
| MARILÂNDIA DO SUL | Fórum local |
| PORECATÚ | Fórum local |
| PRIMEIRO DE MAIO | Fórum local |
| PRIMEIRO DE MAIO | Uso geral forense |
| ROLÂNDIA | Fórum local |
| SERTANÓPOLIS | Fórum local |
| URAÍ | Fórum local |

| SEDE MARINGÁ | UNIDADE |
|-------------------|--------------------|
| ALTO PARANÁ | Fórum local |
| ASTORGA | Fórum local |
| CENTENÁRIO DO SUL | Fórum local |
| COLORADO | Fórum local |
| JANDAIA DO SUL | Fórum local |
| LOANDA | Fórum local |
| MANDAGUAÇÚ | Fórum local |
| MANDAGUARÍ | Fórum local |
| MARIALVA | Fórum local |
| MARIALVA | Uso geral forense |
| MARINGÁ | Fórum local |
| MARINGÁ | Arquivos gerais |
| MARINGÁ | Arquivos |
| MARINGÁ | Fórum Cível |
| MARINGÁ | Juizados Especiais |
| NOVA ESPERANÇA | Fórum local |
| NOVA LONDRINA | Fórum local |
| PARANACITY | Fórum local |
| PARANAVAÍ | Fórum local |
| SANTA FÉ | Fórum local |
| SARANDI | Fórum local |
| TERRA RICA | Fórum local |

| SEDE CRUZEIRO DO OESTE | UNIDADE |
|------------------------|-------------|
| ALTO PIQUIRI | Fórum local |
| ALTÔNIA | Fórum local |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | Fórum local |
| CIDADE GAÚCHA | Fórum local |
| CRUZEIRO DO OESTE | Fórum local |
| FORMOSA DO OESTE | Fórum local |
| GOIOERÊ | Fórum local |
| GUAÍRA | Fórum local |
| ICARAÍMA | Fórum local |

| IPORÃ | Fórum local |
|----------------------|-------------|
| PALOTINA | Fórum local |
| PARAÍSO DO NORTE | Fórum local |
| PÉROLA | Fórum local |
| SANTA ISABEL DO IVAÍ | Fórum local |
| TERRA ROXA | Fórum local |
| UMUARAMA | Fórum local |
| XAMBRÊ | Fórum local |

| SEDE CAMPO MOURÃO | UNIDADE |
|--------------------|--------------------|
| BARBOSA FERRAZ | Fórum local |
| CAMPINA DA LAGOA | Fórum local |
| CAMPO MOURÃO | Fórum local |
| CIANORTE | Fórum local |
| CIANORTE | Juizados Especiais |
| ENGENHEIRO BELTRÃO | Fórum local |
| IRETAMA | Fórum local |
| IVAIPORÃ | Fórum local |
| MAMBORÊ | Fórum local |
| PEABIRÚ | Fórum local |
| SÃO JOÃO DO IVAÍ | Fórum local |
| TERRA BOA | Fórum local |
| UBIRATÃ | Fórum local |

| SEDE CASCAVEL | UNIDADE |
|--------------------------|-------------|
| CAPANEMA | Fórum local |
| CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | Fórum local |
| CASCAVEL | Fórum local |
| CATANDUVAS | Fórum local |
| CORBÉLIA | Fórum local |
| GUARANIAÇÚ | Fórum local |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Fórum local |
| MATELÂNDIA | Fórum local |
| NOVA AURORA | Fórum local |
| QUEDAS DO IGUAÇÚ | Fórum local |
| SANTA HELENA | Fórum local |
| TOLEDO | Fórum local |

| SEDE FOZ DO IGUAÇU | UNIDADE |
|----------------------|-------------|
| FOZ DO IGUAÇÚ | Fórum local |
| MEDIANEIRA | Fórum local |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ | Fórum local |

| SEDE PATO BRANCO | UNIDADE |
|------------------|-------------|
| AMPÉRE | Fórum local |
| BARRACÃO | Fórum local |
| CHOPINZINHO | Fórum local |

| CLEVELÂNDIA | Fórum local |
|---------------------------|-------------|
| CORONEL VIVIDA | Fórum local |
| DOIS VIZINHOS | Fórum local |
| FRANCISCO BELTRÃO | Fórum local |
| MANGUEIRINHA | Fórum local |
| MARMELEIRO | Fórum local |
| PALMAS | Fórum local |
| PATO BRANCO | Fórum local |
| REALEZA | Fórum local |
| SALTO DO LONTRA | Fórum local |
| SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | Fórum local |
| SÃO JOÃO | Fórum local |

| SEDE GUARAPUAVA | UNIDADE |
|--------------------|-----------------|
| CANTAGALO | Fórum local |
| GUARAPUAVA | Fórum local |
| LARANJEIRAS DO SUL | Fórum local |
| MANOEL RIBAS | Fórum local |
| PALMITAL | Fórum local |
| PINHÃO | Fórum local |
| PITANGA | Fórum local |
| PRUDENTÓPOLIS | Fórum local |
| PRUDENTÓPOLIS | Arquivos gerais |
