

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



RELATÓRIO PLANO DE OBRAS
SETEMBRO/2022

SUMÁRIO

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.....	4
1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 5 OBRAS	4
1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS	6
1.1 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 6 OBRAS	7
1.2 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 20 PROJETOS	8
1.3 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 3 PROJETOS	14
1.4 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEEA.....	14
1.5 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS.....	15
2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR.....	16
3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES).....	18
4. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 13 AÇÕES.....	19
5. DESEMBOLSOS TOTAIS.....	20
5.1 - EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (mês do Relatório)	20
6. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS	21
7. DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS.....	22
7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES	22
7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO	23
7.3 MANUTENÇÃO GERADORES.....	23
7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL.....	24
7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER.....	28
7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	29
7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.....	30
7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED	31
7.9 ATIVIDADES RELACIONADAS A ARQUITETURA E DESIGN	31

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 14/10/2022.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
 - a. Todo dado indicado de % *financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento Econômico Financeiro.
 - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
 - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
 - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 5 OBRAS

1	LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL	Construção Bloco Criminal	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 62.624.349,34	ATRASADO
	Contratado	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Emissão OES	março, 2020	
	Data prevista conclusão	junho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	27	
	Prazo decorrido de execução (meses)	31	
	% físico realizado	30,14%	
	Medição realizada	8ª / 20	
	Medição requerida	9ª	
	% financeiro realizado consolidado	41,05%	
	Saldo a pagar	R\$ 36.917.022,98	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		
	Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/2020 realizado 6,75%		

2	AMPÉRE - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 6.133.337,92	ATRASADO
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão	junho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	31	
	Prazo decorrido de execução (meses)	35	
	% físico realizado	58,82%	
	Medição realizada	11ª / 14	
	Medição requerida	12ª	
	% financeiro realizado consolidado	58,82%	
	Saldo a pagar	R\$ 2.525.703,95	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		

3	FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 40.872.133,96	ATRASADO
	Contratado	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2020	
	Data prevista conclusão	agosto, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	21	
	Prazo decorrido de execução (meses)	24	

% físico realizado	37,73%
Medição realizada	10ª / 18
Medição requerida	10ª
% financeiro realizado consolidado	37,73%
Saldo a pagar	R\$ 25.449.402,80
% financeiro não consolidado (se houver)	
Termo de Recebimento	.
Inauguração/Ocupação	

4	CORBÉLIA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 9.411.004,94	ALERTA
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
	Emissão OES	novembro, 2021	
	Data prevista conclusão	fevereiro, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	14	
	Prazo decorrido de execução (meses)	10	
	% físico realizado	13,82%	
	Medição realizada	3ª / 13	
	Medição requerida	0	
	% financeiro realizado consolidado	13,82%	
	Saldo a pagar	R\$ 8.109.950,08	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		

5	NOVA AURORA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 10.662.652,24	OK
	Contratado	BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI	
	Emissão OES	agosto, 2022	
	Data prevista conclusão	agosto, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	2	
	% físico realizado	3,72%	
	Medição realizada	1ª / 12	
	Medição requerida	0	
	% financeiro realizado consolidado	3,72%	
	Saldo a pagar	R\$ 10.265.746,11	
	% financeiro não consolidado (se houver)	3,72%	
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:



1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.

1	BELA VISTA DO PARAÍSO	Construção Fórum Novo
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 8.156.223,56
	Contratado	CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA
	Emissão OES	maio, 2018
	Data prevista conclusão	setembro, 2019
	Prazo previsto execução (meses)	16
	Prazo decorrido de execução (meses)	27 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	100,00%
	Termo de Recebimento	PROV. Março, 2020 sem Definitivo programado programação
	Inauguração/Ocupação	janeiro, 2021
	Conclusão	

2	CURITIBA - PRÉDIO ANEXO	EM OBRA SONORIZAÇÃO PRÉDIO ANEXO
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 4.953.726,74
	Contratado	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	Emissão OES	outubro, 2019
	Data prevista conclusão	maio, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	6
	Prazo decorrido de execução (meses)	36 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	96,78%

Termo de Recebimento	Provisório	PROV. Outubro, 2021
	Definitivo programado	sem programação
Inauguração/Ocupação		outubro, 2021
Conclusão		

1.1 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 6 OBRAS

1	TERRA RICA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 11.198.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitação	dezembro, 2021
	Publicação do Edital	
	Homologação da Licitação	
	Assinatura do Contrato	
	Fase atual	Em licitação

2	PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 14.512.206,02
	Início do procedimento de preparação da licitação	dezembro, 2021
	Publicação do Edital	
	Homologação da Licitação	
	Assinatura do Contrato	
	Fase atual	Em licitação

3	PEABIRÚ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 13.710.150,84
	Início do procedimento de preparação da licitação	julho, 2022
	Publicação do Edital	
	Homologação da Licitação	
	Assinatura do Contrato	
	Fase atual	Em licitação

4	IPORÃ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 14.207.319,91
	Início do procedimento de preparação da licitação	julho, 2022
	Publicação do Edital	
	Homologação da Licitação	
	Assinatura do Contrato	

Fase atual	Em licitação
------------	--------------

5	CAMPO MOURÃO (USINA FOTOVOLTAÍCA)	Usina Fotovoltaica
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 31.128.217,46
	Início do procedimento de preparação da licitação	agosto, 2022
	Publicação do Edital	
	Homologação da Licitação	
	Assinatura do Contrato	
	Fase atual	Em licitação

6	WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 10.500.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitação	setembro, 2022
	Publicação do Edital	
	Homologação da Licitação	
	Assinatura do Contrato	
	Fase atual	Em licitação

1.2 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 20 PROJETOS

1	MARINGÁ - PROJETOS	Construção Fórum Novo	STATUS
	Valor do Contrato (incluindo aditivos)	R\$ 899.994,58	ATRASADO
	Contratado	GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	41	
	Prazo decorrido de execução (meses)	48	
	Previsão de conclusão	março, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	3
	% financeiro realizado consolidado	93,61%	
	Saldo a pagar	R\$ 57.548,84	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	MARINGÁ - ACESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 199.633,89	93,75 %

2	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS	Construção CJC	STATUS
----------	--	-----------------------	---------------

Valor do Contrato (inclu�dos aditivos)	R\$ 4.981.060,31	OK
Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	
Emiss�o OES	junho, 2018	
Prazo previsto execu�o (meses)	56	
Prazo decorrido de execu�o (meses)	52	
Previs�o de conclus�o	fevereiro, 2023	
% f�sico realizado	Fases previstas	6
	Fases recebidas	2
% financeiro realizado consolidado	45,06%	
Saldo a pagar	R\$ 2.736.638,22	
% financeiro n�o consolidado (se houver)		
EM AN�LISE SUSPENS�O DO CONTRATO		
CURITIBA - CENTRO JUDICI�RIO ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
	R\$ 1.077.349,70	63,78 %

3	COLOMBO - PROJETOS	Constru�o F�rum Novo	STATUS
Valor do Contrato (inclu�dos aditivos)	R\$ 457.187,55		ALERTA
Contratado	SOBE SERVI�OS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME		
Emiss�o OES	dezembro, 2019		
Prazo previsto execu�o (meses)	36		
Prazo decorrido de execu�o (meses)	34		
Previs�o de conclus�o	dezembro, 2022		
% f�sico realizado	Fases previstas	5	
	Fases recebidas	1	
% financeiro realizado consolidado	53,47%		
Saldo a pagar	R\$ 212.709,85		
% financeiro n�o consolidado (se houver)			
COLOMBO - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado	
	R\$ 114.800,00	40,00 %	

4	PONTA GROSSA - PROJETOS	Constru�o F�rum Novo	STATUS
Valor do Contrato (inclu�dos aditivos)	R\$ 784.739,75		ALERTA
Contratado	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		

Emissão OES (reinício de contrato)	outubro, 2020	
Prazo previsto execução (meses)	26	
Prazo decorrido de execução (meses)	24	
Previsão de conclusão	dezembro, 2022	
% físico realizado	Fases previstas	5
	Fases recebidas	2
% financeiro realizado consolidado	74,87%	
Saldo a pagar	R\$ 197.184,94	
% financeiro não consolidado (se houver)		
PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO		
	Valor do contrato	% realizado
	R\$ 164.800,00	62,00 %

CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000		
Valor do Contrato (incluindo aditivos)	R\$ 447.447,00	
Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
Emissão OES	julho, 2020	
% físico realizado	Fases previstas	13
	Fases recebidas	3
% financeiro realizado consolidado	24,70%	
Saldo a pagar	R\$ 336.927,59	
% financeiro não consolidado (se houver)		

5	CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	27	
	Previsão de conclusão	fevereiro, 2021	
6	PARANAÍ - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	27	
	Previsão de conclusão	fevereiro, 2021	
7	UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	STATUS
	Emissão OES	julho, 2020	ATRASADO
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	27	

Previsão de conclusão

fevereiro, 2021


NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1500			
Valor do Contrato (incluindo aditivos)	R\$ 397.624,71		
Contratado	JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME		
Emissão OES	fevereiro, 2021		
% físico realizado	Fases previstas	34	
	Fases recebidas	5	
% financeiro realizado consolidado	75,88%		
Saldo a pagar	R\$ 95.900,46		
% financeiro não consolidado (se houver)			
8	JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	18		
Prazo decorrido de execução (meses)	19		
Previsão de conclusão	setembro, 2022		
9	BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500	Construção Novo Fórum	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	18		
Prazo decorrido de execução (meses)	19		
Previsão de conclusão	setembro, 2022		
10	SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	18		
Prazo decorrido de execução (meses)	19		
Previsão de conclusão	setembro, 2022		
11	MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	18		
Prazo decorrido de execução (meses)	19		
Previsão de conclusão	setembro, 2022		
12	WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	fevereiro, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	18		
Prazo decorrido de execução (meses)	19		
Previsão de conclusão	setembro, 2022		

JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLORADO, PRUDENTÓPOLIS, SÃO MATEUS DO SUL, LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800			
Valor do Contrato (incluindo aditivos)	R\$ 208.999,00		
Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME		
Emissão OES	julho, 2021		
% físico realizado	Fases previstas	10	
	Fases recebidas	1	
% financeiro realizado consolidado	9,85%		
Saldo a pagar	R\$ 188.412,60		
% financeiro não consolidado (se houver)			
13	JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	12		
Prazo decorrido de execução (meses)	15		
Previsão de conclusão	julho, 2022		
14	PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	12		
Prazo decorrido de execução (meses)	15		
Previsão de conclusão	julho, 2022		
15	QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	10		
Prazo decorrido de execução (meses)	15		
Previsão de conclusão	maio, 2022		
16	LOANDA - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	11		
Prazo decorrido de execução (meses)	15		
Previsão de conclusão	junho, 2022		
17	MARIALVA - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS
Emissão OES	julho, 2021		ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	12		
Prazo decorrido de execução (meses)	15		
Previsão de conclusão	julho, 2022		
18	SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	STATUS

Emissão OES	julho, 2021	ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	13	
Prazo decorrido de execução (meses)	15	
Previsão de conclusão	agosto, 2022	
19	COLORADO - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
Emissão OES	julho, 2021	ATRASADO
Prazo previsto execução (meses)	11	
Prazo decorrido de execução (meses)	15	
Previsão de conclusão	junho, 2022	

20	CAMPO MOURÃO (USINA FOTOVOLTAICA)	Usina Fotovoltáica	STATUS
Valor do Contrato (incluindo aditivos)	R\$ 0,00		ATRASADO
Contratado	ST ELETRICIDADE		
Emissão OES	janeiro, 1900		
Prazo previsto execução (meses)	9		
Prazo decorrido de execução (meses)	1473		
Previsão de conclusão	janeiro, 1900		
% físico realizado	Fases previstas	3	
	Fases recebidas	0	
% financeiro realizado consolidado	0,00%		
Saldo a pagar	R\$ 0,00		
% financeiro não consolidado (se houver)	#DIV/0!		

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:

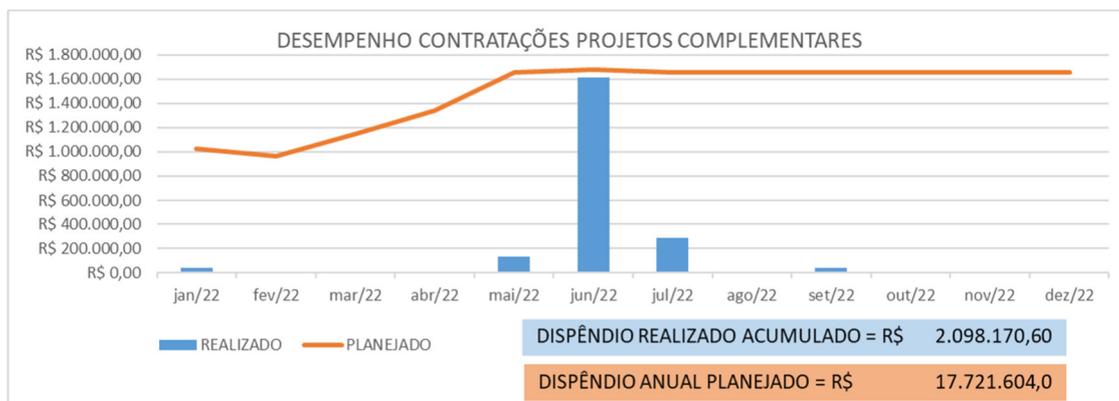

1.3 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 3 PROJETOS

1	MATRIZ 2 FÓRUNS P5000 (ITATI, STO ANTÔNIO DA PLATINA)	Construção Fórum Novo		
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 200.000,00		
	Início do procedimento de preparação da contratação		INICIADO	
	Prazo estimado homologação da contratação		SUSPENSO	
	Prazo estimado emissão OES		SUSPENSO	
	Prazo estimado conclusão dos projetos		SUSPENSO	
	Fase ou localização atual DEA-DP PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES			

2	CURITIBA - SEDE MAUÁ (USINA FOTOVOLTAICA)	Usina Fotovoltáica		
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 23.485,00		
	Início do procedimento de preparação da licitação		FINALIZADO	
	Prazo estimado emissão Edital ao DP		FINALIZADO	
	Prazo estimado publicação do Edital		FINALIZADO	
	Prazo estimado homologação da licitação		FINALIZADO	
	Prazo estimado emissão OES			
Fase ou localização atual DCCO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO				

3	MATRIZ 8 FÓRUNS P 1500 (CENTENÁRIO DO SUL, RIBEIRÃO DO PINHAL, CLEVELÂNDIA, URAÍ, FAXINAL, JOAQUIM TÁVORA, IRETAMA E CARLÓPOLIS)	Construção Fórum Novo		
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 758.858,20		
	Início do procedimento de preparação da licitação		FINALIZADO	
	Prazo estimado emissão Edital ao DP		aguardando	
	Prazo estimado publicação do Edital		aguardando	
	Prazo estimado homologação da licitação		aguardando	
	Prazo estimado emissão OES			
Fase ou localização atual DPCO PARA EDITAL				

1.4 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA

No período não foram elaborados projetos arquitetônicos específicos para obras novas e/ou estudos de viabilidade.

1.5 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS


Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de significativa de *status* nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno em curso.

1	ALTO PARANÁ - PADRÃO 1500 FORA DA LOA 2022	TERRENO OFERTADO CONSIDERADO INADEQUADO AGUARDA POSICIONAMENTO DA COMARJCA	0044842-67.2015	7159920
2	MORRETES - PADRÃO 1500 FORA DA LOA 2022	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0065613-61.2018	7649592
3	PIRAÍ DO SUL - PADRÃO 1500 FORA DA LOA 2022	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0065866-15.2019	7158450
4	CÂNDIDO DE ABREU FORA DA LOA 2022	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	0017074-64.2018	8188927
5	PARANAGUÁ - PADRÃO 10000 FORA DA LOA 2022	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0083854-54.2016	2935335
6	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - (ver também ações a definir) FORA DA LOA 2022	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0055920-19.2019	8220582
7	CAPANEMA - FORA DA LOA 2022	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0026468-61.2019	8155857
8	SENGÉS - FORA DA LOA 2022	EM ANÁLISE NOVO TERRENO	0095784-64.2019	8056796
9	SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ - FORA DA LOA 2022	EM ANÁLISE TERRENOS	0061298-53.2019	7985845
10	PITANGA - PADRÃO 1800 FORA DA LOA 2022	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	0086215-39.2019	8238246
11	MEDIANEIRA - PADRÃO 1800	EM ANÁLISE TERRENOS	0053483-05.2019	7978388
12	PIRAQUARA - PADRÃO 5000 FORA DA LOA 2022	EM ANÁLISE TERRENOS	0080776-47.2019	6366887
13	JAGUAPITÃ	EM ANÁLISE TERRENOS	0075981-27.2021	8174711


2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO		EMIÇÃO
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)		14/10/2022
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)		904
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)		731
	Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio	102
	Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio	59
	Idade média das construções (anos)	26,0
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB)		322.471,30
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)		34.580,19
ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso)		34.367,38
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)		391.418,87
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)		193.034,93
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR		584.453,80
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS		638.798,59
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS		128.193,64
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA		197.843,75
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA		964.835,98
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS	D	45
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS		15
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES		
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS		R\$ 760.826.100,17
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES		R\$ 1.093.585.423,59
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR		R\$ 1.854.411.523,76
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes		
NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR		
1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR		
	EM USO JUDICIÁRIO	SEM USO OU OUTROS USOS
FÓRUNS CENTRAIS	161	0
FÓRUNS ANTIGOS	2	46
IMÓVEIS 2	13	11
IMÓVEIS 3	8	4
IMÓVEIS 4	6	1
IMÓVEIS 5	4	0
IMÓVEIS 6	1	0
TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO INTERIOR	A	195
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)		
2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA		
TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA	B	36
PRÓPRIOS (TJPR):	3	
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):	20	
LOCADOS AO TJPR:	13	
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):	2	
TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO (A+B)		231
TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO) (A+B+C)		293
TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS) (D)		45
TOTAL GERAL DE UNIDADES (A+B+C+D)		338

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE

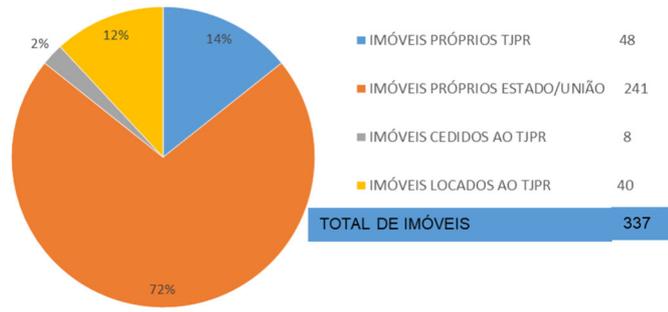

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO

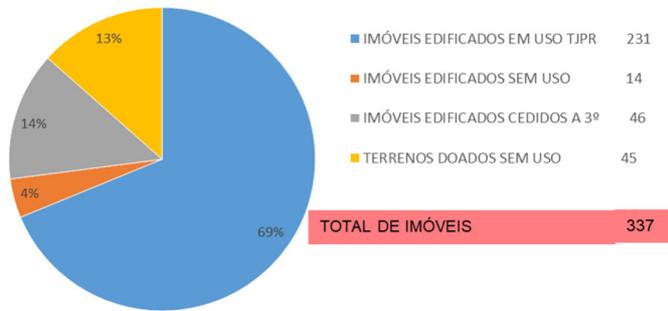

4. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 13 AÇÕES

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas ações, obras e serviços de acessibilidade indicadas em amarelo.


PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE					
COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE					
COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO					
COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO					
COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO					
	COMARCA	STATUS	OES	Observações	MOV. SEI
1	Almirante Tamandaré	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		05/08/2022, Com DP Aguardando manifestação da Comarca. 29/03/2022 Com DAR para esclarecimento quanto ao projeto. 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação	8002804
2	Capanema	ATUALIZANDO PROJETO		05/08/2022, Com DP Aguardando manifestação da Comarca 20/06/2022, Arquitetura alterando projeto. 16/07/2021, enviado para análise da DM 21/06/2021, Com DE para levantamento e contratação	8002804
3	Curitiba - Descentralizado Sta Felicidade	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	06/11/2019	14/10/2022, Consultoria para Termo Aditivo 29/07/2022, Prorrogado prazo de execução do contrato 18/07/2022, Atualizar seguro garantia. 18/02/2022 Formalizado novo aditivo de prazo com mais 45 dias para finalização	8251299
4	Faxinal	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado - com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	6043134
5	Imbituva	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/06 Com DE para levantamento e contratação	7904856
6	Mangueirinha	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação	5149922
7	Morretes	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	7907326
8	Quedas do Iguaçu	CONTRATAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO		03/08/2022, Com DO Encaminhado ao novo Eng. Fiscal 22/06/2022, Encaminhado a Div de Projetos para contratação de projeto elétrico. 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação	8086644
9	Ribeirão Claro	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		24/03/2021 Com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	6204678
10	Santa Helena	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209	01/07/2020	26/01/2021 Recebimento Provisório 6016209 09/07/2020 Reforma contratada OS emitida 180 dias 12/06/2020 Aguarda documentação da construtora	8157540
11	União da Vitória - Fórum Central	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019	4713874
12	São Jerônimo da Serra	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		19/09/2022, Análise da conveniência da contratação 12/08/2022, Encaminhado a Direção do DEA para avaliação em face novo Fórum previsto 03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação	8149144
13	Apucarana	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		04/10/2022, Com DO para levantamento e contratação	5898530
14	Rebouças	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		04/10/2022, Com DO para levantamento e contratação	8246198



5. DESEMBOLSOS TOTAIS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R\$ 3.536.435,17 correspondentes a 4,78 % do valor inicialmente planejado de R\$ 74.014.890,32 para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

	Desembolso no mês do relatório	Desembolso acumulado no ano
Obras em execução ou em Recebimento	R\$ 2.424.553,90	R\$ 21.277.241,98
Proj. complementares	R\$ 39.312,20	R\$ 2.098.170,60
Manutenção e Atas	R\$ 1.072.0569,07	R\$ 13.585.068,39
	R\$ 3.536.435,17	R\$ 36.960.480,97

5.1 - EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (mês do Relatório)

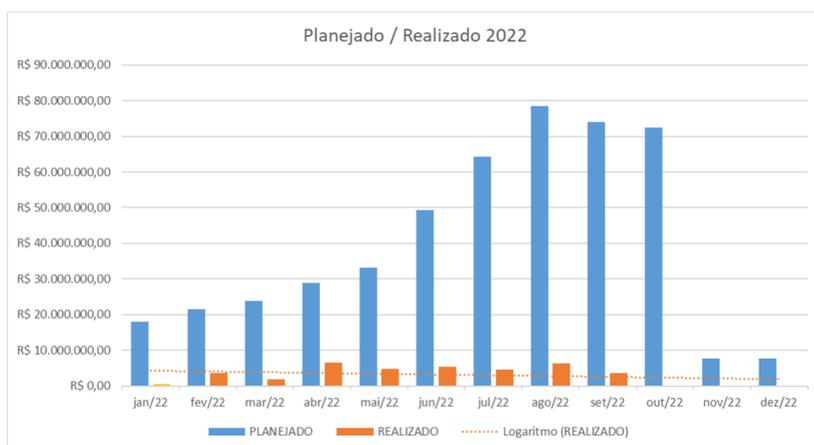

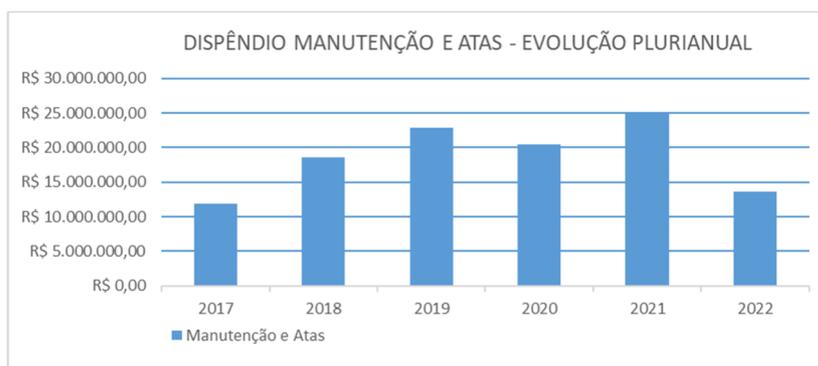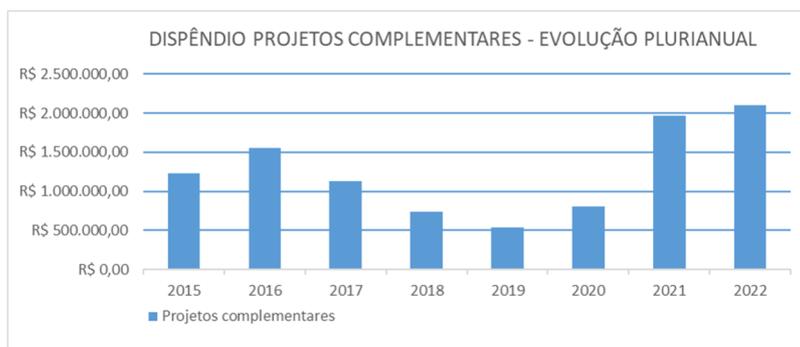


6. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

- a. Manutenção Elevadores
- b. Manutenção Ar condicionado
- c. Manutenção Geradores
- d. Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)
- e. Manutenção Sala Segura e Data Center
- f. Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia
- g. Ata de Instalação de Ar condicionado
- h. Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor no valor de R\$ 1.072.569,07 e acumulado anual de R\$ 13.585.068,39, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

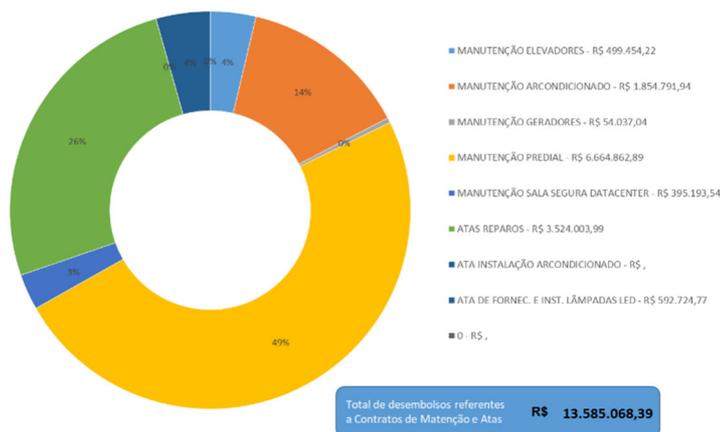

7. DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS


As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face à próximo esgotamento da vigência do contrato: **verde** (não necessita atenção), **amarelo** (final da vigência próximo) e **vermelho** (contrato vencido).

7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 481.501,56
Regional Oeste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 117.597,36
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	04/11/2022	R\$ 154.415,75.

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 499.454,22

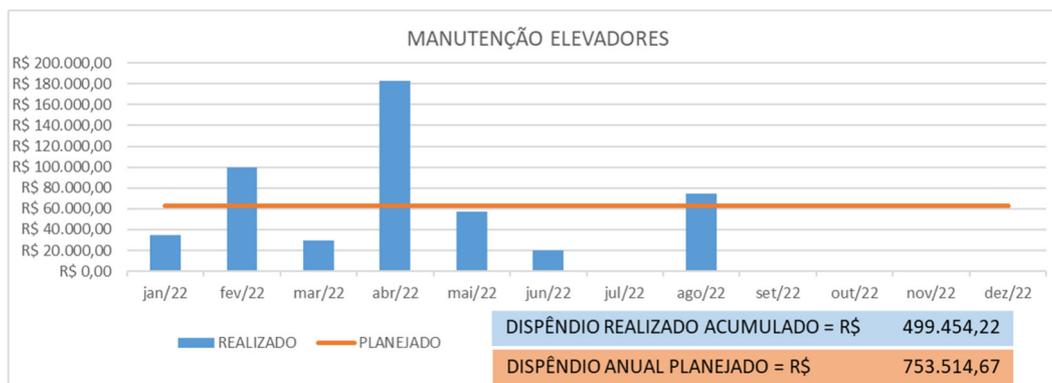


7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	08/02/2023	R\$ 5.759.707,44

Desembolso no período do Relatório	R\$ 658.161,32
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 1.854.791,94

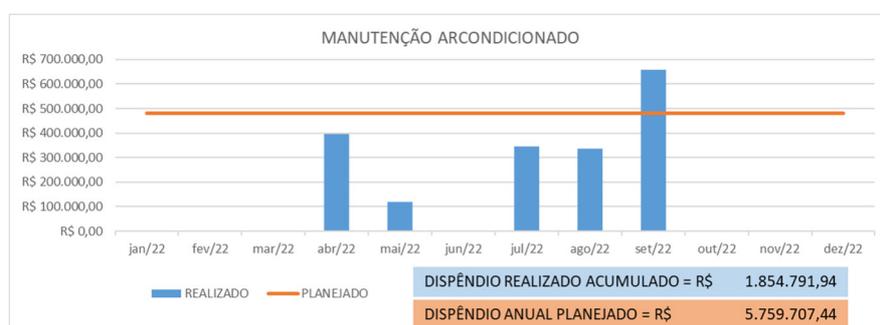


7.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, com fornecimento integral de peças.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME	18/08/2023	R\$ 81.055,56

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 54.037,04

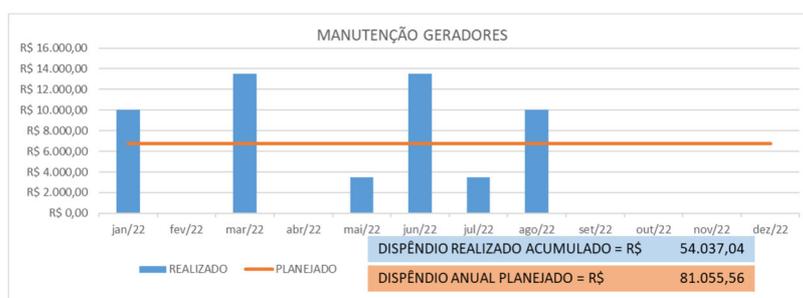


7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços. Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	05/04/2023	R\$ 12.213.699,88

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 6.664.862,89

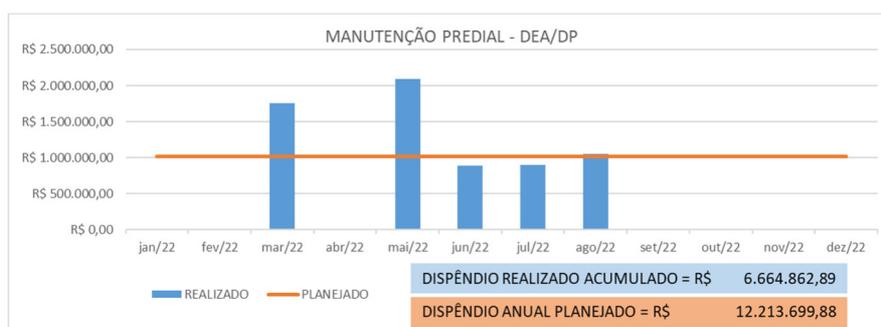

TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência AGOSTO/2022 fornecidos por DEA-DM)

Relação das unidades do contrato

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
CAMPO MOURÃO	Atestado	R\$ 6.206,65
CASCATEL	Atestado	R\$ 6.656,01
CORNÉLIO PROCÓPIO	Atestado	R\$ 7.122,63
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 11.185,44

FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 1.056,65
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 18.018,54
LONDRINA	Atestado	R\$ 24.761,25
MARINGÁ	Atestado	R\$ 12.616,70
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 8.260,48
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 6.485,28
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 2.346,18
TELÊMADO BORBA	Atestado	R\$ 6.019,33
UNIÃO DA VITÓRIA	Atestado	R\$ 4.153,98
13 UNIDADES	TOTAL:	R\$ 114.889,12

Mês de Referência: ago/22

Empresa: EQS
Regional: ENGENHARIA
Contrato: S/A Interior
32/2021

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
ALTO PARANÁ	Atestado	R\$ 286,88
ALTO PIQUIRI	Atestado	R\$ 307,63
ANDIRÁ	Atestado	R\$ 303,97
APUCARANA	Atestado	R\$ 2.707,56
ARAPONGAS	Atestado	R\$ 4.554,00
ARAPOTI	Atestado	R\$ 549,95
ASSAÍ	Atestado	R\$ 1.649,87
BANDEIRANTES	Atestado	R\$ 1.073,71
BARRAÇÃO	Atestado	R\$ 1.244,91
BELA VISTA DO PARAÍSO	Atestado	R\$ 2.451,42
CAMBE	Atestado	R\$ 691,33
CAMPINA DA LAGOA	Atestado	R\$ 257,91
CAMPO MOURAO	Atestado	R\$ 2.210,34
CANTAGALO	Atestado	R\$ 603,25
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	Atestado	R\$ 159,33
CASCAVEL	Atestado	R\$ 3.879,94
CASTRO	Atestado	R\$ 768,74
CATANDUVAS	Atestado	R\$ 128,16
CENTENÁRIO DO SUL	Atestado	R\$ 293,51
CHOPINZINHO	Atestado	R\$ 503,76
CIANORTE	Atestado	R\$ 2.742,01
CIDADE GAÚCHA	Atestado	R\$ 379,75
CLEVELÂNDIA	Atestado	R\$ 15,79
COLORADO	Atestado	R\$ 927,12
CORBÉLIA	Atestado	R\$ 194,46
CORNELIO PROCOPIO	Atestado	R\$ 5.744,95
CORONEL VIVIDA	Atestado	R\$ 595,51
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 1.318,95
CURIÚVA	Atestado	R\$ 41,13
DOIS VIZINHOS	Atestado	R\$ 352,68
FORMOSA DO OESTE	Atestado	R\$ 420,12
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 591,98
FRANCISCO BELTRAO	Atestado	R\$ 529,84
GRANDES RIOS	Atestado	R\$ 1.267,78
GUAÍRA	Atestado	R\$ 99,85

GUARANIÇU	Atestado	R\$ 487,56
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 9.520,43
IBIPORA	Atestado	R\$ 225,87
ICARAÍMA	Atestado	R\$ 2.580,69
IMBITUVA	Atestado	R\$ 136,27
IPIRANGA	Atestado	R\$ 304,12
IPORÃ	Atestado	R\$ 200,93
IRATI	Atestado	R\$ 526,86
IRETAMA	Atestado	R\$ 279,67
JACAREZINHO	Atestado	R\$ 911,44
JAGUAPITA	Atestado	R\$ 308,23
JAGUARIAÍVA	Atestado	R\$ 135,87
JANDAIA DO SUL	Atestado	R\$ 706,12
JOAQUIM TAVORA	Atestado	R\$ 250,68
LARANJEIRAS DO SUL	Atestado	R\$ 19,82
LOANDA	Atestado	R\$ 173,58
LONDRINA	Atestado	R\$ 1.617,34
MALLET	Atestado	R\$ 2.617,93
MAMBORÉ	Atestado	R\$ 181,09
MANDAGUAÇU	Atestado	R\$ 8,24
MANDAGUARI	Atestado	R\$ 740,27
MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Atestado	R\$ 661,52
MARIALVA	Atestado	R\$ 52,70
MARILÂNDIA DO SUL	Atestado	R\$ 386,03
MARINGA	Atestado	R\$ 7.230,86
MARMELEIRO	Atestado	R\$ 372,52
MATELÂNDIA	Atestado	R\$ 76,38
MEDIANEIRA	Atestado	R\$ 464,67
NOVA AURORA	Atestado	R\$ 202,62
NOVA ESPERANÇA	Atestado	R\$ 51,06
NOVA LONDRINA	Atestado	R\$ 538,45
ORTIGUEIRA	Atestado	R\$ 133,23
PALMAS	Atestado	R\$ 225,53
PALMEIRA	Atestado	R\$ 315,18
PALMITAL	Atestado	R\$ 1.775,51
PARAÍSO DO NORTE	Atestado	R\$ 981,81
PARANACITY	Atestado	R\$ 711,19
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 3.380,04
PEABIRU	Atestado	R\$ 109,04
PÉROLA	Atestado	R\$ 267,91
PINHÃO	Atestado	R\$ 851,93
PIRAÍ DO SUL	Atestado	R\$ 1.014,75
PITANGA	Atestado	R\$ 320,48
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 1.017,04
PORECATU	Atestado	R\$ 4.195,20
PRIMEIRO DE MAIO	Atestado	R\$ 284,60
PRUDENTÓPOLIS	Atestado	R\$ 2.701,15
QUEDAS DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 380,84
REALEZA	Atestado	R\$ 816,57
REBOUÇAS	Atestado	R\$ 1.699,11
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 169,48
SALTO DO LONTRA	Atestado	R\$ 223,33
SANTA FÉ	Atestado	R\$ 406,75

SANTA HELENA	Atestado	R\$ 485,20
SANTA ISABEL DO IVAÍ	Atestado	R\$ 139,55
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	Atestado	R\$ 63,12
SÃO JERÔNIMO DA SERRA	Atestado	R\$ 289,61
SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Atestado	R\$ 681,62
SÃO MATEUS DO SUL	Atestado	R\$ 1.277,34
SENGÉS	Atestado	R\$ 175,38
SERTANÓPOLIS	Atestado	R\$ 3.086,19
SIQUEIRA CAMPOS	Atestado	R\$ 511,79
TEIXEIRA SOARES	Atestado	R\$ 135,62
TELEMACO BORBA	Atestado	R\$ 5.005,41
TERRA BOA	Atestado	R\$ 171,79
TERRA RICA	Atestado	R\$ 489,97
TERRA ROXA	Atestado	R\$ 4.021,61
TOMAZINA	Atestado	R\$ 439,67
UBIRATÁ	Atestado	R\$ 254,80
UNIAO DA VITORIA	Atestado	R\$ 2.059,40
URAI	Atestado	R\$ 1.335,83
XAMBRÊ	Atestado	R\$ 466,64
107 CIDADES	TOTAL:	R\$ 114.889,12

Foram realizadas 389 intervenções corretivas e 111 preventivas no período.

Relatório Regional 1

Período considerado - Contrato EQS Engenharia – AGOSTO/2022.

MEDIÇÃO	17
REFERENTE SERVIÇOS	ago/22
SEI	0103947-28.2022.8.16.6000
CIDADE	VALOR APROVADO
Almirante Tamandaré	R\$ 194,68
Antonina	R\$ 1.134,00
Araucária	R\$ 1.991,01
Bocaiúva Do Sul	R\$ 0,00
Campina Grande Do Sul	R\$ 702,95
Campo Largo	R\$ 0,66
Cerro Azul	R\$ 0,00
Colombo	R\$ 0,00
Curitiba	R\$ 87.938,02
Fazenda Rio Grande	R\$ 1.773,64
Guaratuba	R\$ 184,02
Lapa	R\$ 233,62
Matinhos	R\$ 2.159,78

Morretes	R\$ 0,00
Paranaguá	R\$ 3.611,01
Pinhais	R\$ 651,07
Piraquara	R\$ 579,60
Pontal Do Paraná	R\$ 159,14
Rio Branco do Sul	R\$ 0,00
Rio Negro	R\$ 0,00
São José dos Pinhais	R\$ 4.636,23
TOTAL MEDIÇÃO	R\$ 105.949,42
TOTAL ACUMULADO CONTRATO 2	R\$ 540.388,28
TOTAL ACUMULADO 2022*	R\$ 847.138,98
*Total dos pagamentos feitos em 22, inclusive o do consolidado de DEZEMBRO do ano anterior (pago em janeiro)	
ATENDIMENTOS:	
633 Ordens de Serviço do tipo Corretivas foram atendidas de 01/08/2022 à 31/08/2022.	
11 Ordens de Serviço do tipo Preventivas foram atendidas de 01/08/2022 à 31/08/2022.	

7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER


Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	28/07/2023	R\$ 403.635,13

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	01/04/2023	R\$ 293.675,58

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 50.439,90
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 395.193,54

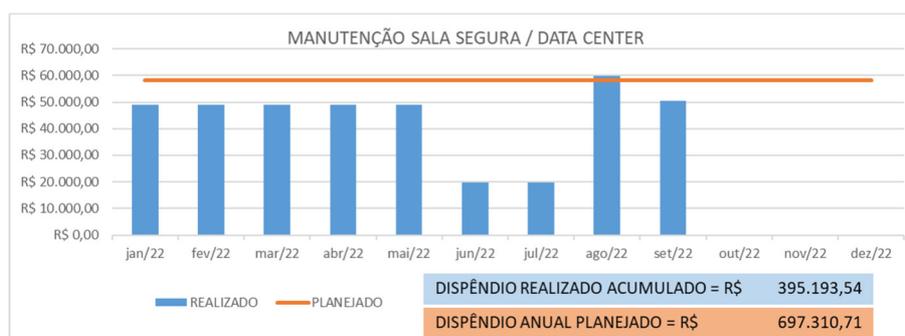


7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Regional Guarapuava	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional RMC e Litoral	JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Cascavel	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	21/09/2021	R\$ 1.000.000,00
Regional Francisco Beltrão	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA	12/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Londrina	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	01/12/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Jacarezinho	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	04/08/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Umuarama	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	29/09/2022	R\$ 1.500.000,00
Regional Ponta Grossa	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	04/08/2022	R\$ 2.000.000,00

Regional Maringá	COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03/05/2023	R\$ 1.000.000,00
Regional Curitiba	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	25/03/2023	R\$ 1.500.000,00

Desembolso no período do Relatório	R\$ 363.967,85
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 3.524.003,99

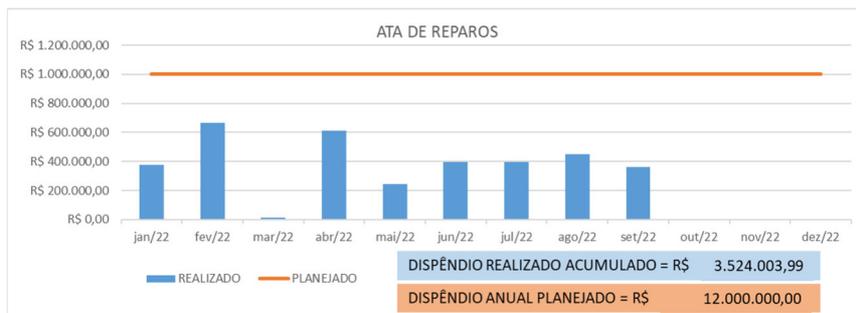


7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Paraná total	ARBOM COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23/06/2023	R\$ 1.200.000,00


Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 0,00

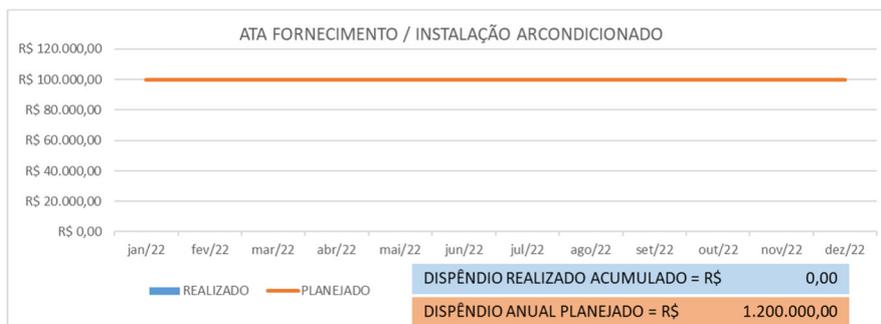

7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED

Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação lâmpadas LED	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP	30/09/2022	R\$ 3.400.089,00

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 592.724,77

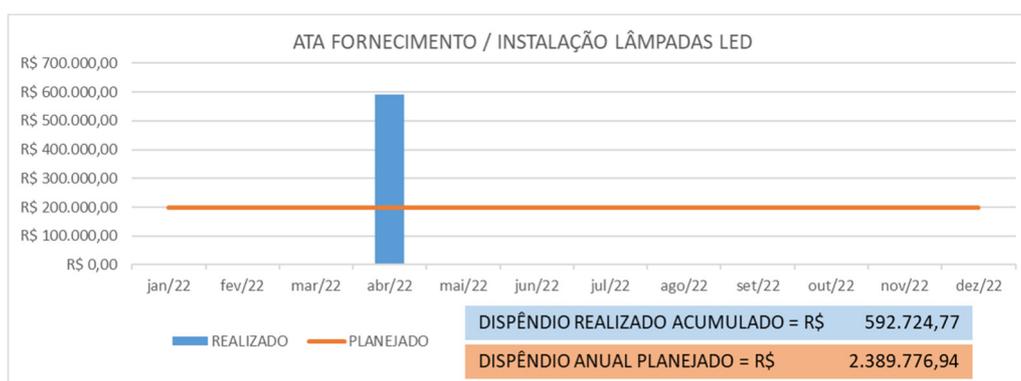

7.9 ATIVIDADES RELACIONADAS A ARQUITETURA E DESIGN

ITEM	ATIVIDADE DAR - SETEMBRO	SONIA	HELENA	GEORGIA	RENATA	GABRIEL	HELIENE
1	ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS	2	1	57			
2	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES			1			
3	ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO			1			
4	ANÁLISE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM			2			
5	ANÁLISE DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO FÓRUM					1	
6	ANÁLISE EDIFÍCIO PARA LOCAÇÃO	1					
7	ANÁLISE ESPAÇOS PARA OCUPAÇÃO						
8	ATUALIZAÇÃO DE PLANTA				1		
9	AVALIAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES						
10	COMUNICAÇÃO EMAILS E INFORMAÇÃO DE PROJETOS		1	41	9	2	
11	CHEFIA - ASSESSORIA			85			
12	ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA, SERVIÇOS			2			
13	LEVANTAMENTO COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA	1					
14	LEVANTAMENTO DO ESPAÇO						
15	LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO	15			2		
16	PARECER TÉCNICO		1				
17	PREENCHIMENTO DE CHECKLIST						
18	PRODUÇÃO DE IMAGENS, RENDERS, PERSPECTIVAS					1	
19	PROJETO ARQUITETÔNICO AMPLIAÇÃO E REFORMA					3	1
20	PROJETO ARQUITETÔNICO FÓRUM NOVO						
21	PROJETO ARQUITETÔNICO REFORMA E READEQUAÇÕES		1		2	5	1
22	PROJETO DE ACESSIBILIDADE		2				
23	PROJETO DE INTERIORES						
24	PROJETO DE LAYOUT (DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO)						
25	PROJETO DE PAISAGISMO				1		
26	PROJETO DE PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO						
27	PROJETO DE REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIO	1					
28	PROJETO EXECUTIVO				1		
29	PROJETO EXECUTIVO DE MOBILIÁRIO					1	
30	REUNIÃO	8	3	28	15	4	2
31	VISITA DE OBRAS, ASSESSORIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO	16		3			4
32	VISITA TÉCNICA, VISTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA	1	1	1	9	3	6
	TOTAL ATIVIDADES	45	10	221	40	20	14
	TOTAL FINAL			350			

ATIVIDADES DE SETEMBRO/2022 - SEÇÃO DE DESIGN	QUANTIDADE
PROJETOS	
Projetos de Comunicação Visual (Curitiba e Região Leste)	10
Informações Comunicação Visual	13
Projetos / Layout de Mobiliário	3
Projetos enviado para empresa de Mobiliário	2
ANÁLISE TÉCNICA	
Cadernos de Especificações Técnicas / Protótipos - Licitações CV / Mobiliários	1
Apreciação / Aprovação de Termo de Referência	1
Análise / Aprovação de Protótipos ou Amostras - Divisão de Controle Patrimonial - DP	7
Informações / Pareceres Licitação	7
Visitas Técnica	6
GESTÃO DE ATA DE COMUNICAÇÃO VISUAL	
Ofícios CV	6
Projetos enviados para empresa CV	6
Cota para DCCO mandar o Empenho e Projeto / envio de corel	8
Coordenação da logística de agendamento para instalação de CV	12
Informação data entrega de CV pela empresa	8
REUNIÕES	
Reuniões semanais	4
TOTAL	82
